



**Ministério
do Esporte**




5º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo)

Cidade-sede: Fortaleza

Setembro/2013

Fortaleza: Distribuição dos Investimentos por Tema e Fonte de Recursos

Referência Set/13, Distribuição dos investimentos por tema. R\$ Milhões

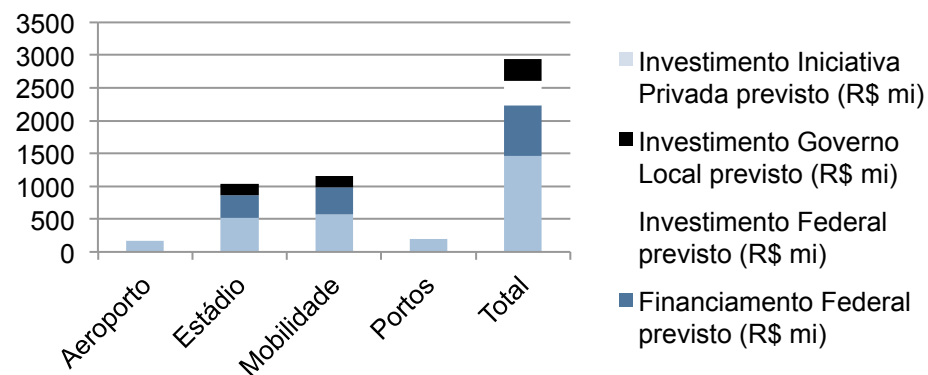

Quantidade
de Projetos



Conteúdo do documento

- Estádio

- Mobilidade

- Aeroporto

- Porto



OBRA ENTREGUE

Fortaleza: Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão)



Tipo de Intervenção: Reforma
Capacidade: 63.763 lugares

Responsável Obra: Governo Estadual
Modelo de Investimento: PPP

Estágio Atual: Concluído

% Execução Obra – Set/13:
Realizado: 100%

Investimento: R\$ 518,6 milhões ¹

Situação Financiamento: Contratado,
 com desembolso de R\$ 351,5 mi

Monitoramento

	Projeto Básico	Processo Licitatório (Obras)	Gerenciamento Obras	Obras (Estádio e Entorno)
Início	Jan/09	Dez/09	Mar/11	Dez/10
Fim	Dez/09	Dez/10	Dez/12	Dez/12
Recurso Estadual (R\$ mi)	5,8	-	-	161,3
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	351,5
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	-	Gov. Estadual (Concessionário)
Situação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

Resultados

- Obra entregue em Dez/12.

Providências



¹ Os valores referentes a projeto executivo, certificação ambiental e operação do estádio estão incluídos no valor das obras. Não inclui valores de gerenciamento. O valor também inclui operação do estádio por 8 anos.


Nota: O entorno do estádio é composto por estacionamentos, prédio da Secretaria de Esportes e praças

Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- Aeroporto
- Porto



Fortaleza: Intervenções em Mobilidade Urbana

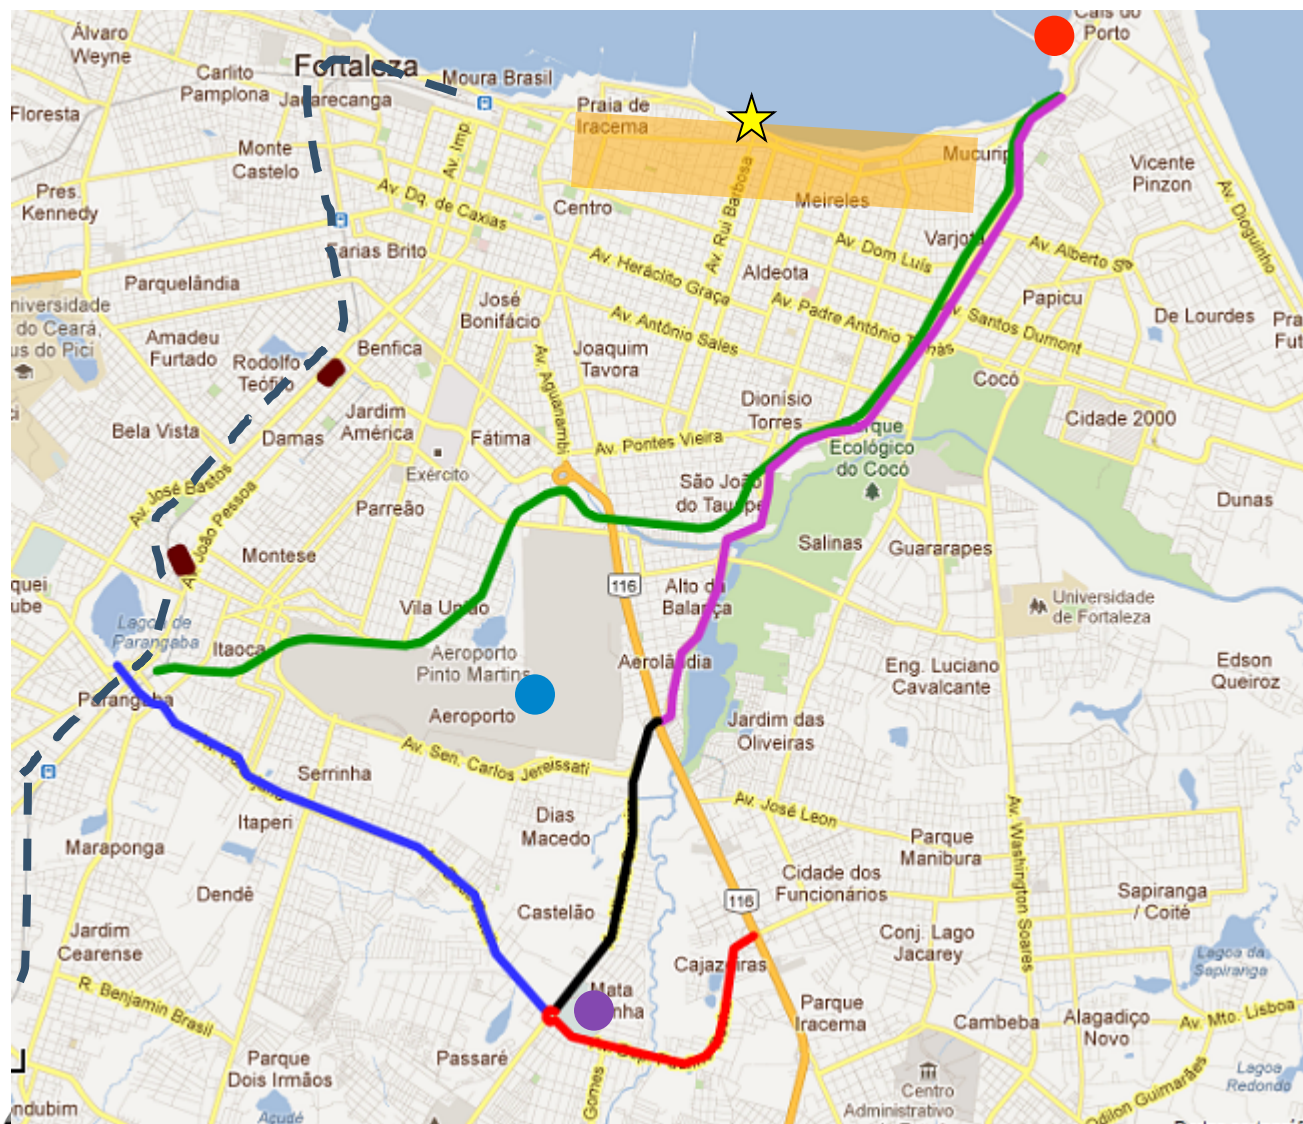

Projetos:

- VLT Parangaba/Mucuripe
- Estações Padre Cícero e JK
- Eixo Via Expressa/Raul Barbosa
- BRT Av. Dedé Brasil
- BRT Av. Alberto Craveiro
- BRT Av. Paulino Rocha

Referências:

- Estádio Castelão
- Aeroporto Pinto Martins
- Porto Mucuripe
- Setor Hoteleiro

Modais:

- Metrô

Eventos:

- ★ Fan Fest



Fortaleza: BRT Avenida Paulino Rocha



Descrição: Ligação da BR-116 à Arena Castelão. Complementa o BRT Dedé Brasil, possibilitando a integração com o Terminal Intermodal da Parangaba.

Escopo: Requalificação viária, com implantação de estações do sistema BRT. 2 km de extensão e 1 obra de arte especial (túnel sob a rotatória).

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 49,22%

Investimento: R\$ 34,6 milhões

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso.

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Jan/11	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Dez/13	Ago/12	Mai/14
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	3,0	-	11,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	19,6
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Imóveis indenizados: 37; de um total de 42 imóveis cadastrados;
- Obras da rotatória concluídas em jun/13 (exceto túnel e alças).

Restrições

Providências

- Avançando nas obras de drenagem do Sistema Viário.



Fortaleza: Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek



Descrição: Implantação de duas estações na Linha Sul do Metrô de Fortaleza

Escopo: 2 estações de metrô

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13

Realizado: 45,77%

Investimento: R\$ 38,22 milhões

Situação Financiamento: 5,73mi de desembolso

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/10	Fev/12	Dez/11	Jun/12
Fim	Abr/11	Nov/13	Jun/12	Dez/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	0,8	1,0	-	3,22
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	33,2
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- 21 processos de desapropriações em homologação e 10 processos concluídos.

Restrições

Providências



Fortaleza: BRT Avenida Alberto Craveiro



Descrição: Ligação do Aeroporto Internacional à Arena Castelão. Complementa ainda o eixo que liga a região hoteleira à Arena Castelão.

Escopo: 3 km e 1 obra d'arte especial

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 96,83%

Investimento: R\$ 33,7 milhões

Situação Financiamento: Contratado. R\$ 11,8 mi de desembolso efetivado.

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Out/10	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Dez/13	Ago/12	Fev/14
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	9,7	-	-
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	23,7
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Trecho: Arena Castelão - Ponte Riacho Uirapuru: 128 desapropriações concluídas.

Restrições

Providências



Fortaleza: VLT Parangaba/Mucuripe



Descrição: Liga Parangaba (terminal intermodal) ao Mucuripe (Porto e região hoteleira), passando pela Rodoviária e Aeroporto

Escopo: 13 km e 10 estações

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 25,0%

Investimento: R\$ 275,45 milhões

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 53,6 mi

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Mai/10	Mai/10	Out/11	Mar/12
Fim	Jul/11	Fev/14	Fev/12	Abr/14
Recurso Estadual (R\$ mi)	3,3	92,2	-	9,95
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	170,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Material rodante já adquirido;
- 988 laudos de desapropriação concluídos, destes 482 já estão pagos.

Restrições

Providências

- Início dos testes e operação assistida do VLT - Jan/14 a Mar/14 .



Fortaleza: Eixo Via Expressa / Raul Barbosa



Descrição: Via de ligação entre Zona Hoteleira e o Aeroporto Internacional.

Escopo: 7 km e 5 obras d`arte especiais

Responsável: Governo Municipal
Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:
Realizado: 7,71%

Investimento: R\$ 151,6 milhões

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso.

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Jul/10	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Mar/14	Ago/12	Mai/14
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	3,8	-	5,8
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	141,7
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
Resultados		Restrições		Providências
<ul style="list-style-type: none">• Indenizados 70 imóveis de 265 cadastrados (1 Viaduto Raul Barbosa + 3 Túneis Via Expressa);• Em andamento, repasse de R\$ 36 mi (para desapropriações), do Governo Estadual para o Municipal, através de Convênio, objetivando a construção dos túneis da Via Expressa.				<ul style="list-style-type: none">• Início de 3 obras de arte até Nov/13.



Fortaleza: BRT Avenida Dedé Brasil



Descrição: Liga o Terminal Intermodal da Parangaba (Estação final do VLT Parangaba / Mucuripe) à Arena Castelão

Escopo: Requalificação viária, com implantação de estações do sistema BRT. 6 km de extensão e 2 obras de arte especiais (viadutos)

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra –Set/13:

Realizado: 9,11%

Investimento: R\$ 41,6 milhões

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso.

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Set/10	Out/11	Fev/12
Fim	Jul/11	Mar/14	Ago/12	Mai/14
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	10,0	-	9,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	21,6
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Desapropriações: 137 imóveis cadastrados.

Restrições

Providências

- Iniciar as obras dos 2 viadutos até Nov/13.



Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- Aeroporto
- Porto



Fortaleza: Aeroporto Internacional Pinto Martins

TPS e Sistema Viário



Projeto: TPS e Sistema Viário

Descrição: Projeto executivo, reforma e ampliação do Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves e Adequação do Sistema Viário

Modelo de Investimento: Público (Infraero)

Responsável: Governo Federal (Infraero)

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:
Realizado: 24,81%

Investimento: R\$ 171,11 milhões

Monitoramento

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental¹	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Set/09	Jun/12	Mar/13	Dez/11	Jun/12
Fim	Out/11	Mar/14	Jul/13	Mai/12	Mar/14
Recurso Federal (R\$ mi)	4,6	-	-	-	166,51 ²
Execução	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Estadual (SEMACE)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Concluído	Em Andamento

Resultados	Restrições	Providências
<ul style="list-style-type: none"> Obra do Pátio concluída em Mai/13 		

¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras. Licenciamento Ambiental com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto.

² Projeto Executivo contratado juntamente com a obra

Legenda: SEMACE - Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará



Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- Aeroporto
- **Porto**



Fortaleza: Terminal Marítimo de Fortaleza (Mucuripe)



Projeto: Porto de Fortaleza - Terminal Marítimo de Passageiros

Descrição:
Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, Construção de Cais para 1 Berço para Múltiplo Uso, Pavimentação e Urbanização de Via Interna de Acesso, Estacionamento e Pátio

Modelo de Investimento: Público (SEP)

Responsável: Governo Federal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 68,4 %

Investimento: R\$ 202,6 milhões

Monitoramento

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Mai/11	Mar/12	Jun/10	Out/11	Mar/12
Fim	Ago/11	Jun/12	Jan/12	Fev/12	Mai/14
Recurso Federal (R\$ mi)	-	-	-	-	202,6
Execução	Gov. Federal (CDC)	Gov. Federal (CDC)	Gov. Estadual (SEMACE)	Gov. Federal (CDC)	Gov. Federal (CDC)
Situação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento
<div> <div>Resultados</div> <div>Restrições</div> <div>Providências</div> </div>					
<ul style="list-style-type: none"> - Assinado 3º TA ao Contrato da Obra (R\$ 171,9 milhões), em 30/09/2013 - % de execução: <ul style="list-style-type: none"> Cais: 85 % Aterro (Hidráulico): 95%; Terminal: 35%. 					



Legenda: SEMACE - Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará
CDC - Companhia Docas do Ceará
