



Ministério  
do Esporte




# 4º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo)

## Cidade-sede de Brasília

Dezembro de 2012

# Brasília: Distribuição dos Investimentos por Tema e Fonte de Recursos

Referência Nov/12, Distribuição dos investimentos por tema. R\$ Milhões

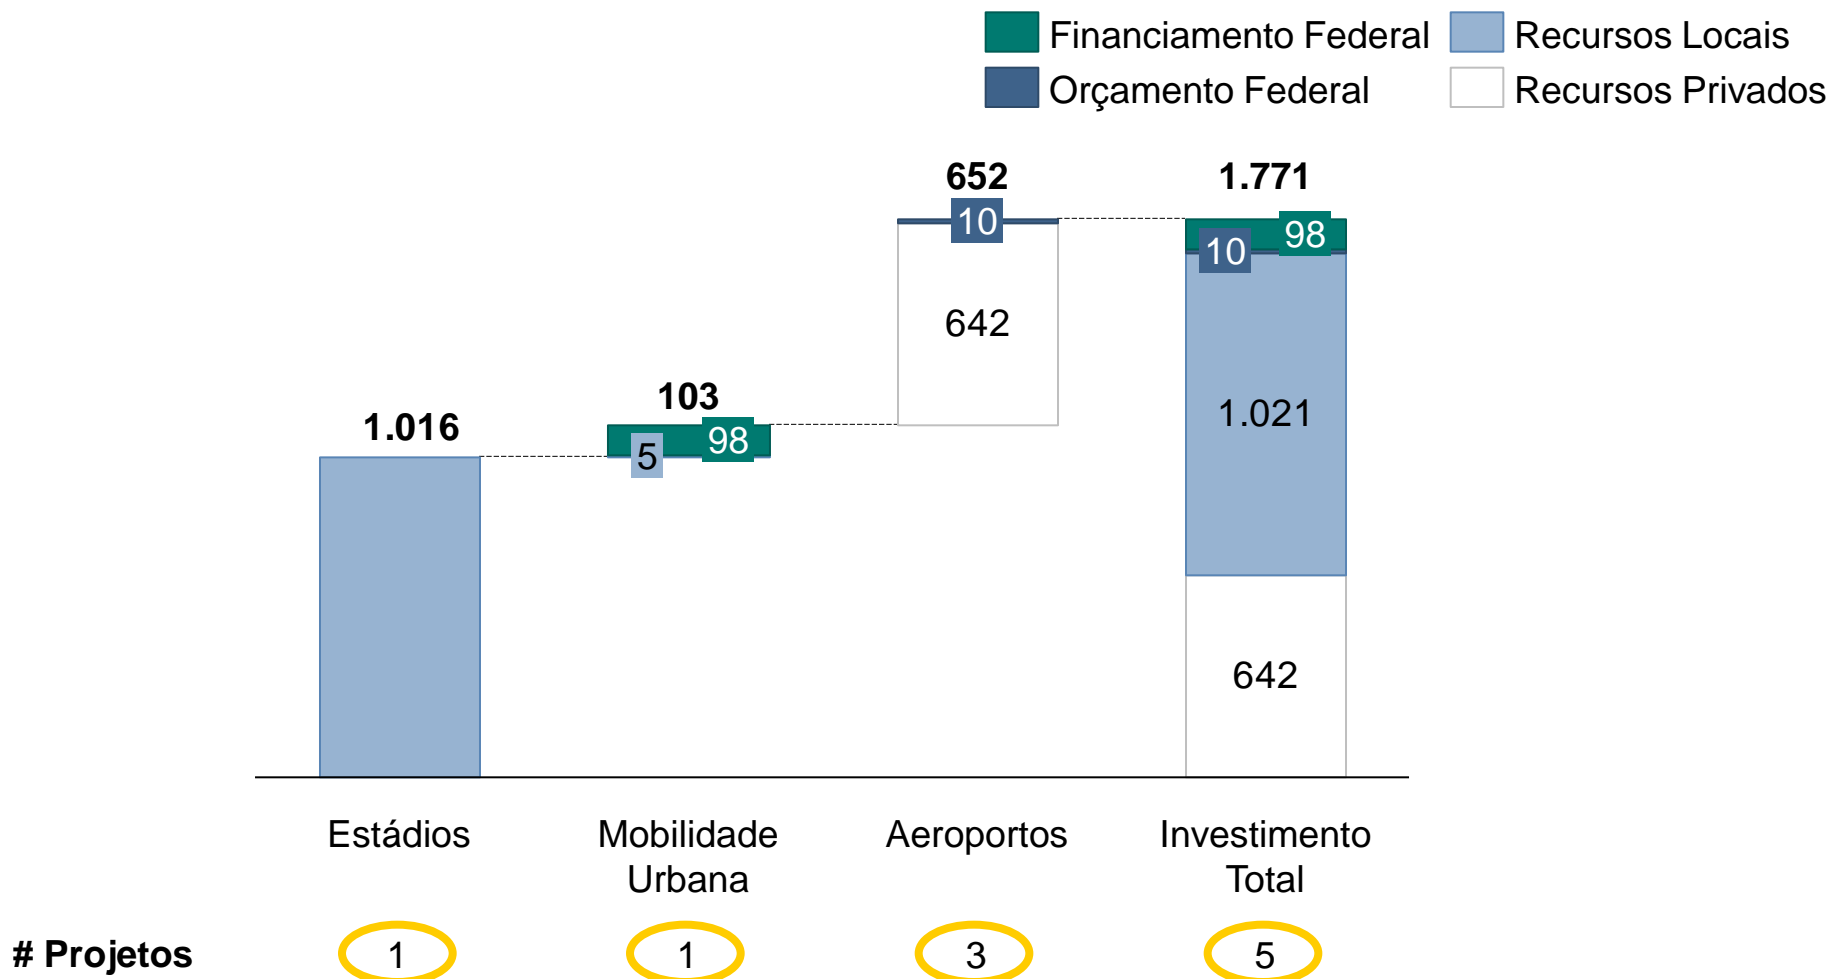

# Conteúdo do documento

- Estádio

- Mobilidade Urbana

- Aeroporto



# Brasília: Estádio Nacional de Brasília



**Tipo de Intervenção:** Reconstrução

**Capacidade:** 72.777 lugares

**Responsável Obra:** Governo Distrital

**Modelo invest.:** Público

**Estágio Atual:** Em Obras

**% Execução Obra - Nov/12:**

**Previsto:** 72,3%

**Realizado:** 78,0%

**Investimento:** R\$ 1.015,6 milhões

• Gov. Distrital: R\$ 1.015,6 mi (100%)

**Situação Financiamento:** Não solicitará financiamento

## Monitoramento

	Projeto Básico	Processo Licitatório	Gerenciamento Obras	Obras (Estádio)
<b>Início</b>	Jul/09	Ago/09	Dez/11	Jul/10
<b>Fim</b>	Jul/10	Jul/10	Abr/13	Abr/13
<b>Recurso Distrital (R\$ mi)</b>	5,3	-	-	1.010,3
<b>Execução</b>	Gov. Distrital	Gov. Distrital	Gov. Distrital	Gov. Distrital
<b>Situação</b>	Concluído	Concluído	Em Andamento	Em Andamento

**Em Andamento:** Estrutura de concreto/Esplanada, contraventamento de pilares da Esplanada, instalações, cobertura

Resultados	Restrições	Providências
<ul style="list-style-type: none"> <li>RECOPA aprovado no M. Esporte em Mar/12 e habilitado na Receita Federal em Mar/12 (ADE/RFB nº34 de 19/Mar/12)</li> <li>Cobertura contratada em Mar/12</li> <li>Assinado contrato dos placares/telões em Ago/12, assentos em Set/12 e gramado/drenagem em Nov/12</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicar licitação de urbanização e comunicação visual externa - Dez/12</li> <li>Iniciar plantio do gramado - Fev/13</li> </ul>

\* Os valores referentes ao projeto executivo, certificação ambiental, cobertura, assentos, placares eletrônicos e telões, de gramado, sistema de drenagem e irrigação estão incluídos no valor de obras do estádio. O item comunicação visual externa e urbanização ainda não está contratado e não há previsão de valor.

Nota 1: O entorno é composto por esplanada e estacionamento e não está incluído no valor da obra do estádio

Nota 2: No valor das obras do estádio é considerada a isenção tributária referente ao RECOPA, estimada em R\$ 36,3 milhões para a estrutura da arena e R\$ 6,4 milhões para a cobertura, somando R\$ 42,7 milhões

Legenda: RECOPA – Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol

# Conteúdo do documento

- Estádio

- **Mobilidade Urbana**

- Aeroporto



# Brasília: Intervenções em Mobilidade Urbana



### Projetos:

— Ampliação da DF-047

### Referências:

● Estádio Nacional de Brasília

● Rodoviária do Plano Piloto

● Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek

● Terminal da Asa Sul

■ Setor Hoteleiro

### Modais:

--- Metrô

### Eventos:

★ Fan Fest



# Brasília: DF-047



**Descrição:** Ampliação de capacidade da rodovia DF-047 (acesso ao aeroporto)

**Escopo:** 2,1 km, 3 obras de arte especiais e intervenções viárias .

**Responsável:** Governo Distrital

**Estágio Atual:** Contratada

**% Execução Obra:** Não Iniciada

**Previsto:** -

**Realizado:** -

**Investimento:** R\$ 103,1 milhões

- Gov. Distrital: R\$ 5,1 mi (5%)
- Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 98,0 mi (95%)

**Situação Financiamento:** Contratado, sem desembolso

## Monitoramento

	Projeto Básico	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
<b>Início</b>	Mai/11	-	Ago/12	Dez/12
<b>Fim</b>	Fev/13	-	Abr/13	Dez/13
<hr/>				
<b>Recurso Distrital (R\$ mi)</b>	0,8	-	-	4,3
<b>Recurso Federal</b>				
<b>Financiamento (R\$ mi)</b>	-	-	-	98,0
<hr/>				
<b>Execução</b>	Gov. Distrital	-	Gov. Distrital	Gov. Distrital
<hr/>				
<b>Situação</b>	Em Andamento	Não se Aplica	Em Andamento	A Iniciar

Resultados	Restrições	Providências
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto readequado conforme solicitações do TCDF protocolado em Mai/12.</li> <li>• Iniciado Projeto Básico do viaduto em frente ao Terminal 2 em out/12</li> <li>• Assinado contrato de obras e Ordem de Serviço da DF 047 em Nov/12 (Aguardando fim do período de chuvas para início da obra)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licitar Projeto Executivo e Obras do viaduto de acesso ao Terminal 2 em Mar/13</li> </ul>



Nota: Empreendimento dividido em 2 lotes

# Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade Urbana

- **Aeroporto**





# Brasília: Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – Concessão



**Projeto:** Concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Brasília – Fase 1B

**Modelo de Investimento:** Privado (Concessionário)

**Responsável:** Concessionário

**Estágio Atual :** Contratado

**Execução Obra :** não iniciada

**Investimento:** R\$ 642,4 milhões

## Monitoramento

	Projeto Executivo	Processo de Concessão (leilão)	Assinatura de Contrato	Obras
<b>Início</b>	-	Jul/11	Mar/12	Dez/12
<b>Fim</b>	-	Fev/12	Jun/12	Mai/14
<b>Recurso Privado (R\$ mi)</b>	-	-	-	R\$ 642,4 <sup>1</sup>
<b>Execução</b>	Concessionário	Gov. Federal (ANAC)	Gov. Federal (ANAC)	Concessionário
<b>Situação</b>	Não Iniciado	Concluído	Concluída	Não Iniciadas

### Resultados

- ANAC: Aprovou o Plano de Transferência Operacional - PTO - em Ago/12

### Restrições

- ANAC: Analisar Projetos e Planos de Investimentos até Jan/13

### Providências



<sup>1</sup> Valor informado pela concessionária e passível de alteração.  
Nota: intervenções diversas já foram iniciadas pelo concessionário por seu próprio risco desde Out/12

# Brasília: Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – Módulo Operacional



**Projeto:** Módulo Operacional

**Descrição:** Implantação de Módulo Operacional

**Modelo de Investimento:** Público (Infraero)

**Responsável:** Governo Federal (Infraero)

**Estágio Atual:** Concluído

**% Execução Obra:** 100%

**Investimento:** R\$ 4,6 milhões

## Monitoramento

	Projeto Básico <sup>1</sup>	Licenciamento Ambiental	Processo Licitatório (Obras)	Obras
<b>Início</b>	Mai/11	-	Jun/11	Ago/11
<b>Fim</b>	Mai/11	Jul/11	Ago/11	Jun/12
<b>Recurso Federal (R\$ mi)</b>	-	-	-	4,6
<b>Execução</b>	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Distrital (IBRAM)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
<b>Situação</b>	Concluído	Dispensado	Concluído	Concluídas

**Resultados**

**Restrições**

**Providências**



<sup>1</sup> Valor do projeto básico incluído nos custos administrativos da INFRAERO  
 Nota: Projeto Executivo sob responsabilidade do contratado  
 Legenda: IBRAM – Instituto Brasília Ambiental

# Brasília: Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek – Reforma do Corpo Central do TPS

## Monitoramento

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental <sup>2</sup>	Processo Licitatório (Obra)	Obras
<b>Início</b>	Fev/09	Nov/10	-	Dez/10	Abr/11
<b>Fim</b>	Out/10	Nov/11	Jun/10	Abr/11	Dez/12
<b>Recurso Federal (R\$ mi)</b>	-	-	-	-	R\$ 5,5 <sup>1</sup>
<b>Execução</b>	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Distrital (IBRAM)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
<b>Situação</b>	Concluído	Concluído	Dispensado	Concluído	Em Andamento

### Resultados

### Restrições

### Providências

- Obra de reforma do corpo central do TPS (Ação Prioritária) concluído em Nov/12
- Em andamento: recomposição no vidro do elevador do satélite



**Projeto:** Reforma do Terminal de Passageiros

**Descrição:** Reforma do Corpo Central do Terminal de Passageiros

**Modelo de Investimento:** Público (Infraero)

**Responsável:** Governo Federal (Infraero)

**Estágio Atual:** Em Obras

**% Execução Obra - Nov/12:**  
Realizado: 100 %

**Investimento:** R\$ 5,5 milhões



<sup>1</sup> Não inclui o valor do Licenciamento Ambiental, sendo este definido a partir do processo de licenciamento junto ao órgão ambiental competente

<sup>2</sup> Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras

Nota: Os valores referentes aos Projetos Básico e Executivo estão contemplados nos Projetos de Ampliação Sul do TPS

Legenda: IBRAM – Instituto Brasília Ambiental
