



**Ministério
do Esporte**



5º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo)


Cidade-sede: Recife

Setembro/2013

Recife: Distribuição dos Investimentos por Tema e Fonte de Recursos

Referência Set/13, Distribuição dos investimentos por tema. R\$ Milhões

- Financiamento Federal
- Investimento Federal
- Investimento Privado
- Investimento Local

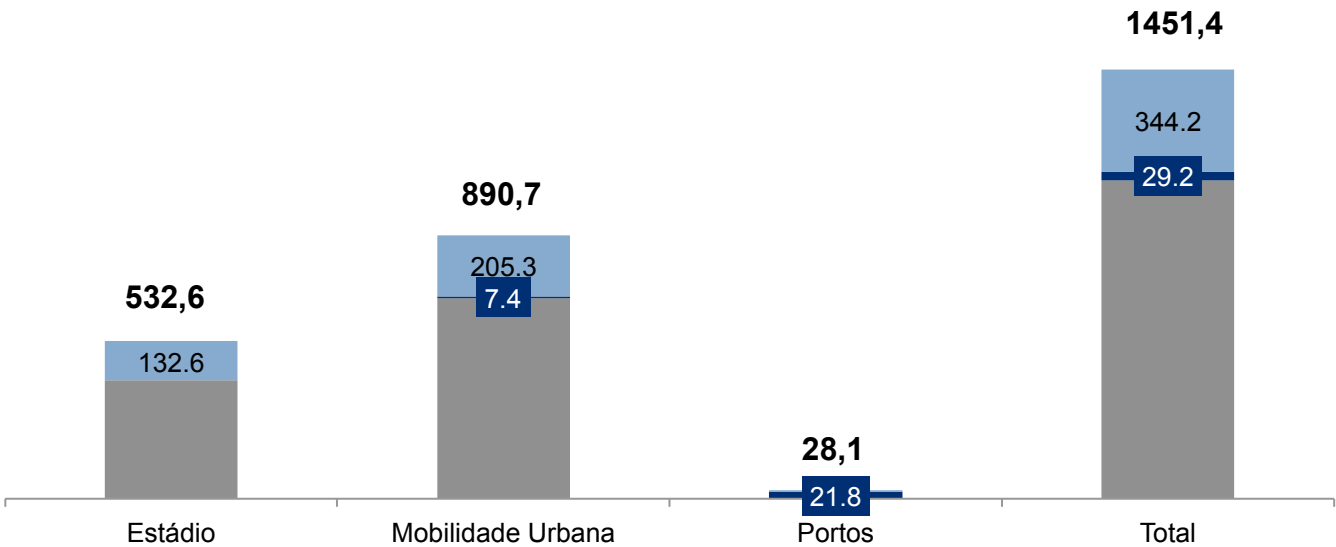

Quantidade de Projetos



Conteúdo do documento

- Estádio

- Mobilidade

- Porto



OBRA ENTREGUE

Recife: Arena Pernambuco



Tipo de Intervenção: Construção de novo estádio

Capacidade: 46.000 lugares

Responsável Obra: Governo Estadual

Modelo de Investimento: PPP

Estágio Atual: Concluída

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 100,0%

Investimento: R\$ 532,6 milhões

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 3,8 mi

Monitoramento

	Projeto Básico	Desapropriação	Projeto Executivo	Gerenciamento Obras ³	Obras (Estádio e Entorno ¹)
Início	Out/08	Mai/10	Dez/09	Dez/11	Ago/10
Fim	Jun/09	Jul/10	Jun/10	Mai/13	Mai/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	9,3	5,9	14,4		103,0
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	5,4 ²	394,6 ²
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual/Concessionário
Situação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

Resultados

- Obra do estádio entregue em Mai/13

Providências



¹ O entorno é composto por estacionamento e áreas de circulação

² O valor do financiamento foi dividido em duas parcelas: Sub crédito A (R\$ 5,4 mi) e Sub crédito B (R\$ 394,6 mi)


³ Os valores referentes à auditoria estão incluídos no valor do gerenciamento da obra

Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- Porto



Recife: Intervenções em Mobilidade Urbana

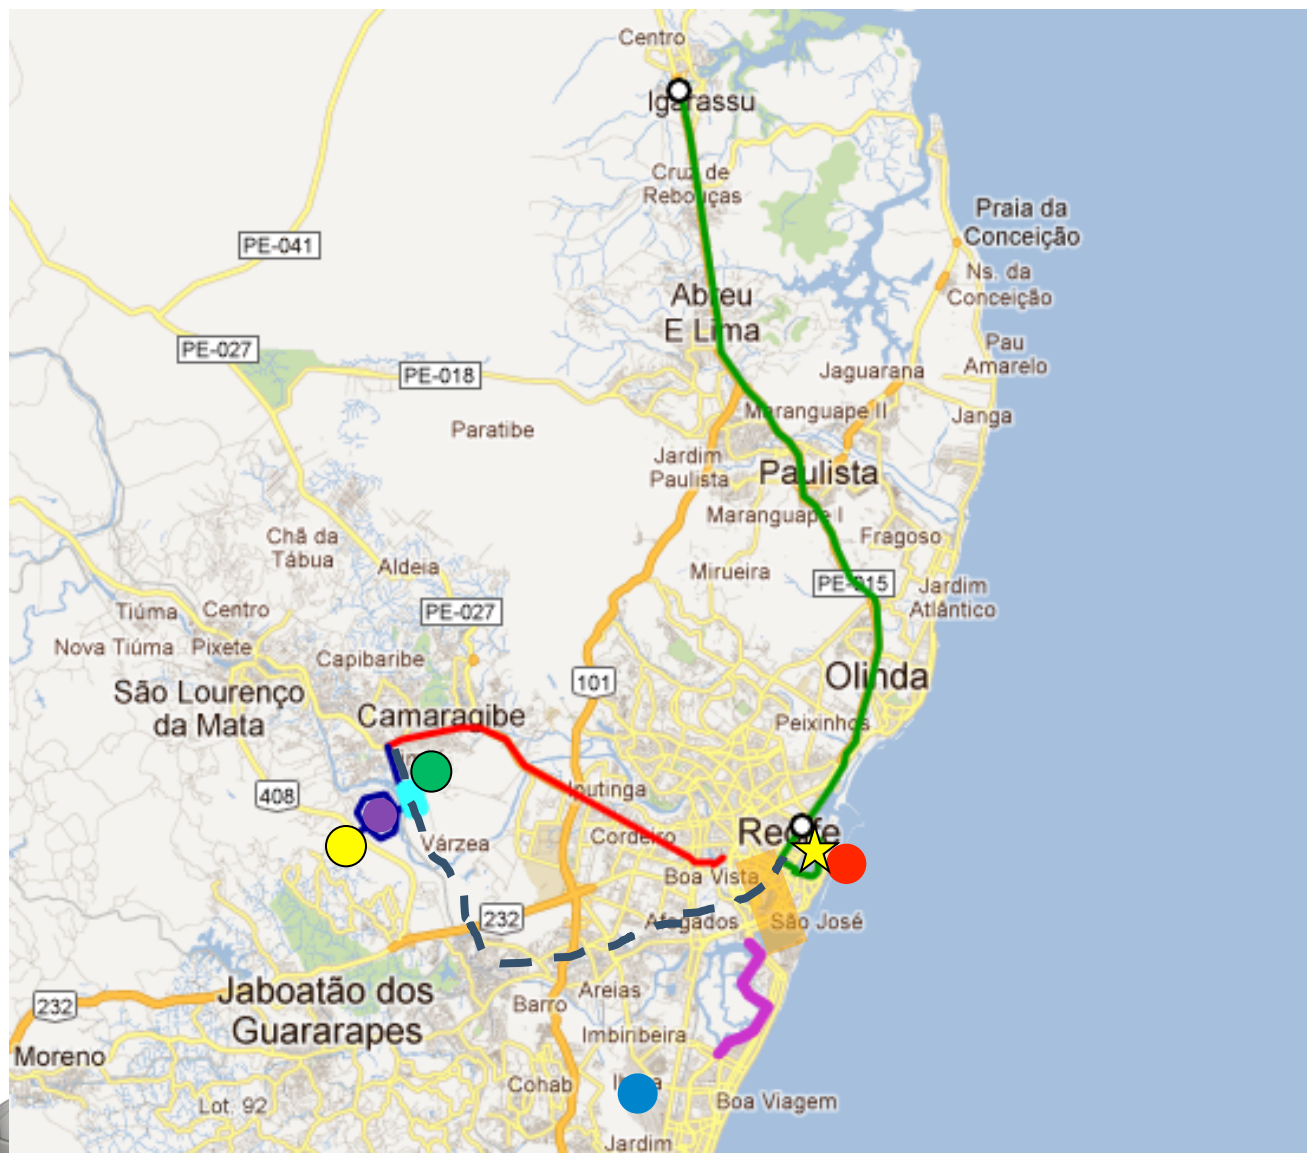

Projetos:

- BRT Norte/Sul – Trecho Igarassu / Tacaruna / Centro do Recife
- Terminal Cosme e Damião
- Corredor Via Mangue
- Corredor Caxangá (Leste/Oeste)
- BRT Ramal Cidade da Copa
- Viaduto da BR-408
- Estação de Metrô Cosme e Damião

Referências:

- Arena Pernambuco
- Aeroporto Internacional do Recife/ Guararapes
- Terminal Marítimo
- Setor Hoteleiro

Modais:

- Metrô

Eventos:

- ★ Fan Fest

Recife: Corredor Via Mangue



Descrição: Liga a região central aos bairros de Boa Viagem e Pina

Escopo: 4,5 km

Responsável: Governo Municipal
Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:
Realizado: 67,96%

Investimento: R\$ 433,2 milhões

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 204,0 mi

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório(Obras)	Obras
Início	Mar/07	Mai/10	Dez/10	Abr/11
Fim	Ago/11	Jul/13	Abr/11	Abr/14
Recurso Municipal (R\$ mi)	4,6	33,9	-	63,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	331,0
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Concluída	Concluído	Em Andamento
Resultados		Restrições		Providências



Recife: BRT Norte / Sul - Trecho Igarassu / Tacaruna / Centro do Recife



Descrição: BRT que liga o Terminal Integrado de Igarassu ao Centro, conectando-se à Estação de Metrô Recife

Escopo: 33,3 km, 29 estações, reforma de 3 terminais, construção de 1 terminal e 3 viadutos

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 64%

Investimento: R\$ 180,9 milhões

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 77,9 mi

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Jul/09	Set/11	Ago/11	Dez/11
Fim	Abr/13	Dez/13	Nov/11	Mar/14
Recurso Estadual (R\$ mi)	- ¹	2,0	-	16,9
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	162,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Concluídos os Viadutos Bultrins Leste, Bultrins Oeste e Ouro Preto. Construção do Terminal Integrado de Abreu e Lima em avançado estágio de obra. Iniciadas obras de adequação dos Terminais Integrados de Igarassu e Pelópidas da Silveira

Restrições

Providências

- Concluir negociação dos imóveis a serem desapropriados até Dez/13



¹ Os projetos foram pagos pelo Consórcio de Transporte Metropolitano e repassados à Secretaria do Governo Estadual sem custo

Recife: BRT Leste / Oeste - Ramal Cidade da Copa



Descrição: BRT que liga o Corredor Caxangá (Leste/Oeste) ao Terminal Cosme e Damião, à Cidade da Copa e à BR-408

Escopo: 5,8 km e 5 obras de arte especiais

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:
Realizado: 71%

Investimento: R\$ 137,0 milhões

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 50,2 mi

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório(Obras)	Obras
Início	Jun/10	Set/11	Ago/11	Nov/11
Fim	Mar/13	Dez/13	Out/11	Mar/14
Recurso Estadual (R\$ mi)	- ¹	12,0	-	26,0
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	99,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
Resultados		Restrições	Providências	
<ul style="list-style-type: none"> Ramal interno concluído em Jun/13 (trecho na Cidade da Copa e obra de arte) 			<ul style="list-style-type: none"> Fazer gestão junto à Justiça para solicitar celeridade na conclusão dos processos de desapropriação 	

¹ Os projetos foram pagos pelo Consórcio de Transporte Metropolitano e repassados à Secretaria do Governo Estadual sem custo



Recife: Corredor Caxangá (Leste / Oeste)



Descrição: Corredor com BRT que liga a Praça do Derby, passando pela Av. Caxangá, ao Terminal Integrado de Camaragibe

Escopo: 12,5 km, 20 estações e 2 terminais

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 45%

Investimento: R\$ 88,1 milhões

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 31,9 mi

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Jul/10	Set/11	Ago/11	Dez/11
Fim	Abr/13	Dez/13	Nov/11	Mar/14
Recurso Estadual (R\$ mi)	- ¹	10,0	-	7,1
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	71,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Concluída desapropriação da Estação 1 da Av. Belmino Correia, do TI da III Perimetral e do TI da IV Perimetral. Concluída a estação nº 05 da Av. Caxangá.

Restrições

Providências

- Concluir avaliação dos imóveis a serem desapropriados até Dez/13
- Fazer gestão junto à Justiça para solicitar celeridade na conclusão dos processos de desapropriação



¹ Os projetos foram pagos pelo Consórcio de Transporte Metropolitano e repassados à Secretaria do Governo Estadual sem custo

Recife: Terminal Cosme e Damião



Descrição: Implantação de terminal de ônibus integrado com a estação Cosme e Damião do metrô

Escopo: 1 terminal

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Paralisada

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 51,62%

Investimento: R\$ 19,1 milhões

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 8,7 mi

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório(Obras)	Obras
Início	Abr/10	Set/11	Ago/11	Dez/11
Fim	Dez/12	Jul/13	Out/13	Dez/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	- ¹	1,0	-	3,1
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	15,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Em Andamento	Concluído	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Processo licitatório concluído em Out/13.
- Desapropriação concluída
- Obra reiniciada em 04/11/13.

Restrições

Providências

- Reiniciar a obra até Nov/13.



¹ Os projetos foram pagos pelo Consórcio de Transporte Metropolitano e repassados à Secretaria do Governo Estadual sem custo

OBRA ENTREGUE

Recife: Entorno Arena Pernambuco: Viaduto da BR-408



Descrição: Construção do viaduto que liga a BR-408 à Cidade da Copa

Escopo: 1 obra de arte especial

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Concluída

% Execução Obra – Set/13:
Realizado: 100,0%

Investimento: R\$ 25,0 milhões

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Obras
Início	Set/10	-	Dez/11
Fim	Dez/10	-	Mar/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	0,5	-	24,5
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-
Execução	Gov. Estadual	-	Gov. Estadual
Situação	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento

Resultados

- Obra concluída em Mar/13.

Restrições

Providências



Recife: Entorno Arena Pernambuco: Estação de Metrô Cosme e Damião



Descrição: Construção da Estação de Metrô Cosme e Damião (Linha Centro)

Escopo: 1 estação

Responsável: Governo Estadual - CBTU

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Set/13:

Realizado: 95%

Investimento: R\$ 7,4 milhões

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Obras
Início	Jan/08	-	Fev/10
Fim	Mai/08	-	Mai/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	-	-	-
Recurso Federal (R\$ mi)	0,24	-	7,13
Execução	Gov. Estadual	-	Gov. Estadual
Situação	Concluído	Não se Aplica	Em Andamento
	Resultados	Restrições	Providências



Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- **Porto**



OBRA ENTREGUE

Recife: Terminal Marítimo



Projeto: Porto do Recife SA – Terminal Marítimo de passageiros

Descrição: Adaptação do Armazém 7 e Construção de Nova Área para Terminal Marítimo de Passageiros, Pavimentação, Urbanização de Acessos e Estacionamento

Modelo de Investimento: Público

Responsável: Governo Federal (SEP)

Estágio Atual: Concluída

% Execução Obra – Set/13:
Realizado: 100%

Investimento: R\$ 28,1 milhões

Monitoramento

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Set/09		Mar/11	Ago/11	Nov/11
Fim	Jul/11		Out/11	Nov/11	Ago/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	-	-	-	-	6,3
Recurso Federal (R\$ mi)	-	-	-	-	21,8
Execução	Gov. Estadual (Porto do Recife SA)	Gov. Estadual (Sectma/ CPRH-PE)	Gov. Estadual (Porto do Recife SA)	Gov. Estadual (Porto do Recife SA)	Gov. Estadual (Porto do Recife SA)
Situação	Concluídos	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
Resultados		Restrições		Providências	

- Obra entregue em ago/13



Legenda: Sectma - Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente
CPRH - Agência Estadual de Meio Ambiente
