



Ministério
do Esporte



Balanço 2012 - Copa do Mundo Cidade-sede Fortaleza

Brasília, Abril de 2012

Valores Consolidados

R\$ mi, abr/12

	Total Empreendimentos	Investimento Total	Financiamento Federal	Recurso Local	Recurso Federal
Estádio	1	518,6	351,5	167,1	
Mobilidade Urbana	6	562,0	409,8	152,2	
Aeroportos	1	349,8			349,8
Portos	1	149,0			149,0
Total	9	1.579,4	761,3	319,3	498,8



Conteúdo do documento

- **Estádio**

- Mobilidade Urbana
- Aeroporto
- Porto



Fortaleza: Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão)



Tipo de Intervenção: Reforma

Capacidade: 67.037 lugares

Responsável Obra: Governo Estadual

Modelo invest.: PPP

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: 62%

Investimento: R\$ 518,6 milhões ¹

• Gov. Estadual: R\$ 167,1 mi (32%)

• Gov. Federal (financ. BNDES): R\$ 351,5 mi (68%)

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 175,0 mi

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Processo Licitatório (Obras)	Gerenciamento Obras	Obras (Estádio e Entorno)
Início	Jan/09	Dez/09	Mar/12	Dez/10
Fim	Dez/09	Dez/10	Dez/12	Dez/12
Recurso Estadual (R\$ mi)	5,8	-	-	161,3
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	351,5
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	-	Gov. Estadual / Concessionário
Situação	Concluído	Concluído	Em Andamento	Em Andamento

Em Andamento: terraplenagem , fundações, estrutura e instalações; (3ª e 4ª etapas)

Resultados

Restrições

Providências

- Gerenciamento contratado em mar/12



¹ Os valores referentes a projeto executivo, certificação ambiental e operação do estádio estão incluídos no valor das obras . O entorno do estádio é composto por estacionamentos, prédio da Secretaria de Esportes e praças. Não inclui valores de gerenciamento.

Conteúdo do documento

- Estádio


- **Mobilidade Urbana**

- Aeroporto

- Porto



Fortaleza: Mobilidade urbana - geral

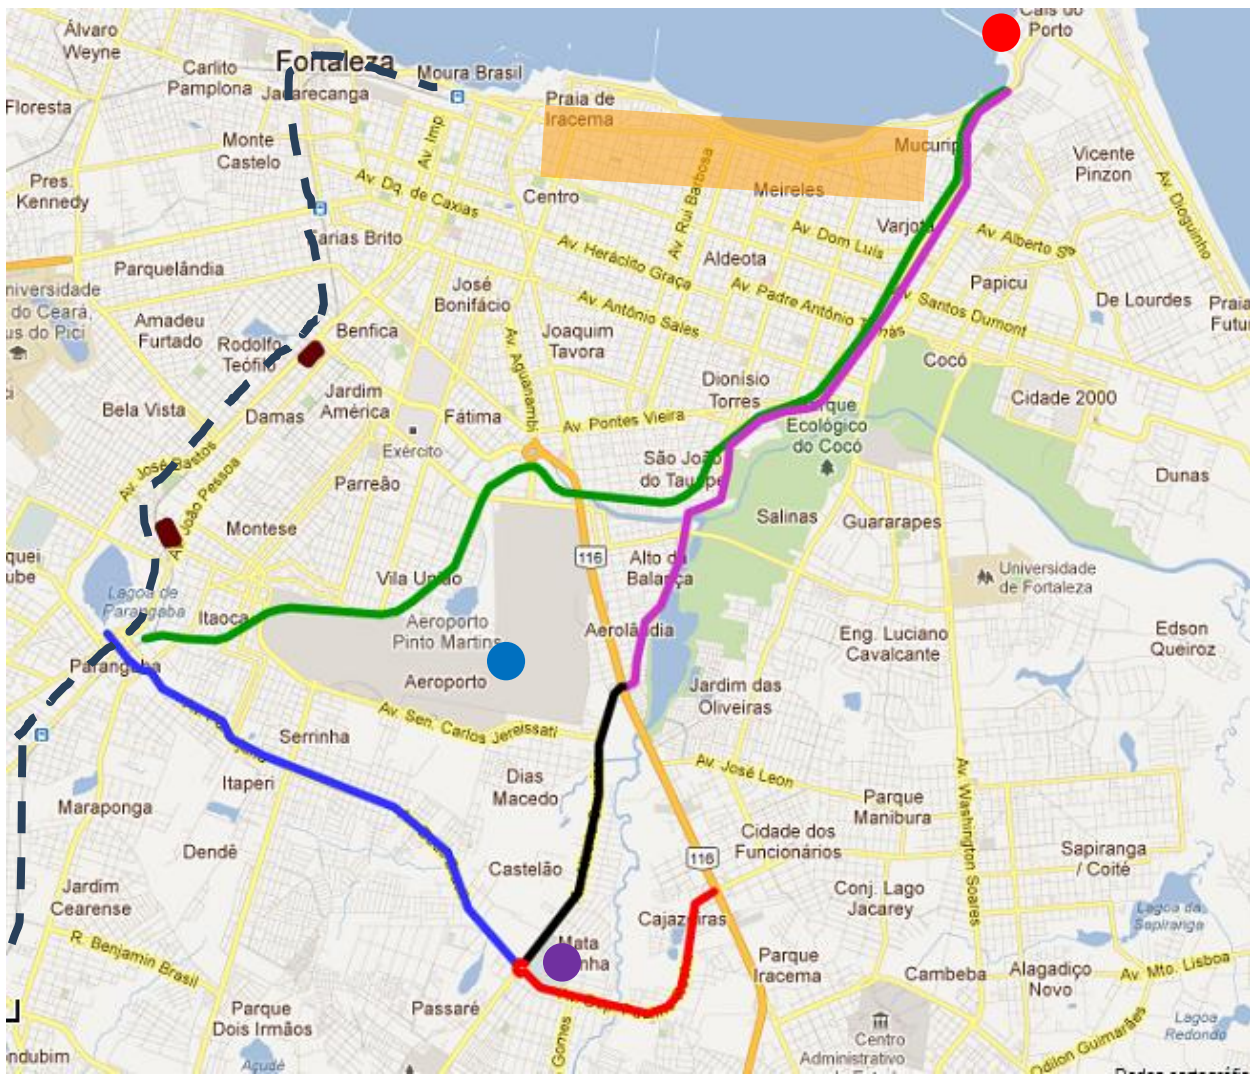

Projetos:

- VLT Parangaba/Mucuripe
- Eixo Via Expressa/Raul Barbosa
- BRT Av. Dedé Brasil
- BRT Av. Alberto Craveiro
- BRT Av. Paulino Rocha

Referências:

- Estádio Castelão
- Aeroporto Pinto Martins
- Porto Mucuripe
- Setor Hoteleiro

Modais:

- - - Metrô



Fortaleza: VLT Parangaba/Mucuripe



Descrição: Liga Parangaba (terminal intermodal) ao Mucuripe (Porto e região hoteleira), passando pela Rodoviária e Aeroporto

Escopo: 13 km e 10 estações

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: Iniciada, sem medição

Investimento: R\$ 265,5 milhões

• Gov. Estadual: R\$ 95,5 mi (36%)

• Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$170,0 mi (64%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

Abril de 2012

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Mai/10	Mai/10	Out/11	Mar/12
Fim	Jul/11	Set/13	Fev/12	Set/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	3,3	92,2	-	-
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	170,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Licença de Instalação emitida em fev/12

Restrições

- Processo de desapropriação

Providências



Fortaleza: Eixo Via Expressa / Raul Barbosa



Descrição: Via de ligação entre Zona Hoteleira a Arena Castelão. Lote 1 – Via Expressa e Lote 2 – Raul Barbosa

Escopo: 7 km e 5 obras de arte especiais

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: Iniciada, sem medição

Investimento: R\$ 151,6 milhões

• Gov. Municipal: R\$ 9,9 mi (6,5%)

• Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$141,7 mi (93,5%)

Situação Financiamento: Não Contratado

Monitoramento

Abril de 2012

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Jul/10	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Dez/12	Jun/12	Ago/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	3,8	-	5,8
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	141,7
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluído	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento

Resultados

- Iniciada obra do Lote 1 em Jan/12

Restrições

- Publicar edital de licitação para contratação das obras do lote 2 em mai/12

Providências



Nota: Obra dividida em 2 lotes.

Fortaleza: BRT Avenida Dedé Brasil



Descrição: Liga o Terminal Intermodal da Parangaba (estação final do VLT Parangaba/Mucuripe) ao estádio

Escopo: Requalificação de via com implantação de estações do sistema BRT, 6 km e 2 obras de arte especiais (viadutos)

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: Iniciada, sem medição

Investimento: R\$ 41,6 milhões

• Gov. Municipal: R\$ 20,0 mi (48%)

• Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 21,6 mi (52%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

Abril de 2012

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Set/10	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Dez/12	Jun/12	Ago/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	10,0	-	9,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	21,6
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluído	Em Andamento	Em Andamento	Em Andamento

Resultados

- Iniciada obra do Lote 1 em Jan/12

Restrições

Providências

- Publicar edital de licitação para contratação de obras das 2 obras de arte em mai/12



Nota: Obra dividida em 2 lotes.

Fortaleza: BRT Avenida Alberto Craveiro



Descrição: Liga o BRT Raul Barbosa ao estádio, parte do eixo que liga a região hoteleira ao estádio

Escopo: 3 km e 1 obra de arte especial

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: Iniciada, sem medição

Investimento: R\$ 33,7 milhões

- Gov. Municipal: R\$ 10,0 mi (29,7%)
- Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 23,7 mi (70,3%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

Abril de 2012

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Out/10	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Dez/12	Jan/12	Ago/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	9,7	-	-
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	23,7
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento
	Resultados	Restrições	Providências	



Fortaleza: BRT Avenida Paulino Rocha



Descrição: Continuação do BRT Dedé Brasil para ligação do Terminal Intermodal da Parangaba e a BR 116 ao estádio

Escopo: Requalificação de via com implantação de estações do sistema BRT, 2 km e 1 obra de arte especial (túnel na rotatória)

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: Iniciada, sem medição

Investimento: R\$ 34,6 milhões

•Gov. Municipal: R\$ 15,0 mi (43%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 19,6 mi (57%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

Abril de 2012

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Jan/11	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Dez/12	Jan/12	Jun/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	3,0	-	11,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	19,6
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

Restrições

Providências



Fortaleza: Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek



Descrição: Implantação de duas estações na Linha Sul do Metrô de Fortaleza

Escopo: 2 estações de metrô

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Licitação

% Execução Obra: Não Iniciada

Investimento: R\$ 35,0 milhões

•Gov. Estadual: R\$ 1,8 mi (5%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 33,2 mi (95%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

Abril de 2012

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/10	Fev/12	Dez/11	Jul/12
Fim	Abr/11	Ago/12	Jun/12	Jun/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	0,8	1,0	-	-
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	33,2
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluído	Em Andamento	Em Andamento	Não Iniciadas
	Resultados	Restrições	Providências	



Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- **Aeroporto**
- Porto



Fortaleza: Aeroporto Internacional Pinto Martins



Projeto: TPS e Sistema Viário

Descrição: Projeto executivo, reforma e ampliação do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário (1ª Fase)

Modelo de Investimento: Público (Infraero)

Responsável: Governo Federal (Infraero)

Estágio Atual: Em Licitação

% Execução Obra: Não Iniciada

Investimento: R\$ 349,8 milhões

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental ¹	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Set/09	Mai/12	Set/10	Dez/11	Mai/12
Fim	Out/11	Dez/13	Jul/11	Abr/12	Dez/13
Recurso Federal (R\$ mi)	← 11,0 →		-	-	338,8
Execução	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Estadual (SEMACE)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
Situação	Concluído	Não Iniciado	Concluído	Concluído	Não Iniciadas
	Resultados	Restrições	Providências		

¹ Licenciamento Ambiental com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto. Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras
 Legenda: SEMACE - Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará



Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- Aeroporto
- **Porto**



Fortaleza: Terminal Marítimo de Fortaleza (Mucuripe)



Porto de Fortaleza: Terminal Marítimo de Passageiros

Descrição:

- Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros
- Construção de Cais para 1 Berço para Múltiplo Uso
- Pavimentação e Urbanização de Via Interna de Acesso e Estacionamento e Pátio

Modelo de Investimento: Público (SEP)

Responsável: Governo Federal (SEP)

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: Iniciada, sem medição

Investimento: R\$ 149,0 milhões

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental ¹	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Mai/11	Mar/12	Jun/10	Out/11	Mar/12
Fim	Ago/11	Jun/12	Jan/12	Fev/12	Nov/13
Recurso Federal (R\$ mi)	-	-	-	-	149,0
Execução	Gov. Federal (CDC)	Gov. Federal (CDC)	Gov. Estadual (SEMACE)	Gov. Federal (CDC)	Gov. Federal (CDC)
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Concluído	Em Andamento

Resultados

Restrições

Providências

- Publicar licitação de itens ainda não contratados (ar condicionado, escada rolante, elevadores e defensas)



Legenda: SEMACE - Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará
CDC - Companhia Docas do Ceará
