



**Ministério  
do Esporte**



# **3º Balanço das ações do Governo Brasileiro para a Copa- Abril 2012**

Brasília, Maio de 2012


# Conteúdo do documento

- Visão geral das ações

- Visão por tema



# Ciclos dos preparativos do Governo para a Copa

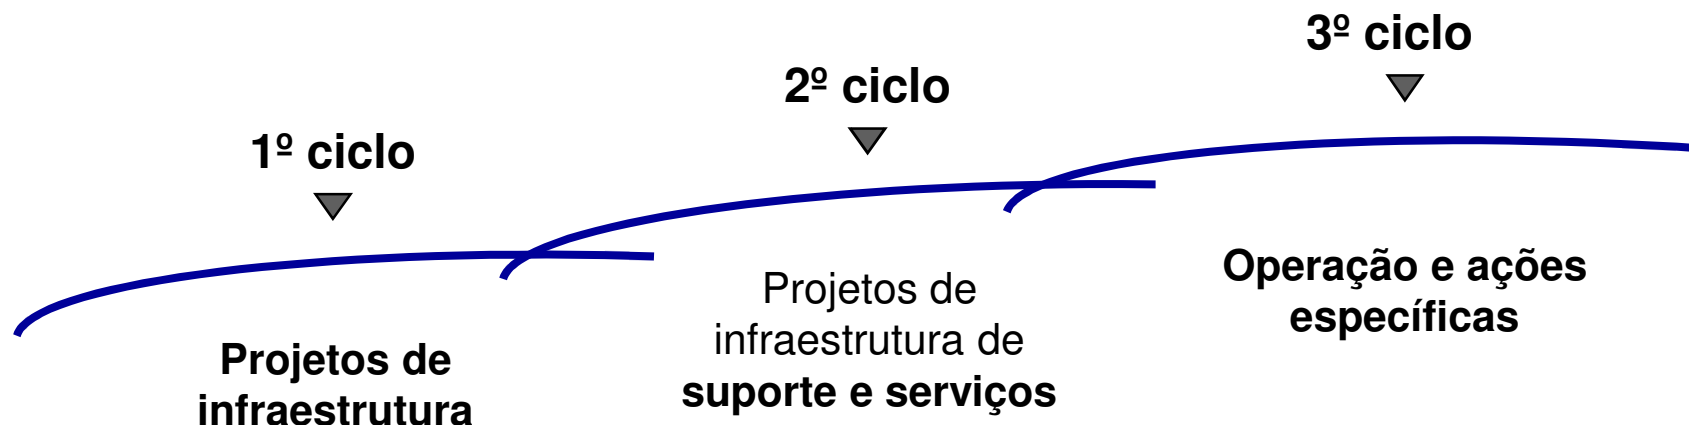

- **Definição de projetos** - assinados na Matriz de Responsabilidades:
  - 12 estádios
  - 51 em mobilidade urbana
  - 31 em 13 aeroportos
  - 7 em portos

- **Em discussão:**
  - Segurança
  - Telecomunicações e TI
  - Energia
  - Infraestrutura turística
  - Saúde
  - Promoção do país

- **A serem discutidos:**
  - Malha aérea, operação aeroportuária e portuária
  - Operação de transporte e mobilidade urbana
  - Fornecimento de energia
  - Saúde, prevenção e pronto socorro
  - Estruturas temporárias para a Copa

← 2009-2010 →

← 2011 – 2012 →


← 2012-2013 →



# Os empreendimentos de infraestrutura esportiva e de transporte para a Copa (1º ciclo de planejamento) somam R\$ 27 bi

1º Ciclo de Planejamento, R\$ Bilhões, Abr/12, Distribuição dos projetos por origem dos recursos

- Gov. Estadual e Municipal
- Financiamento Federal
- Recurso Federal
- Recurso Privado

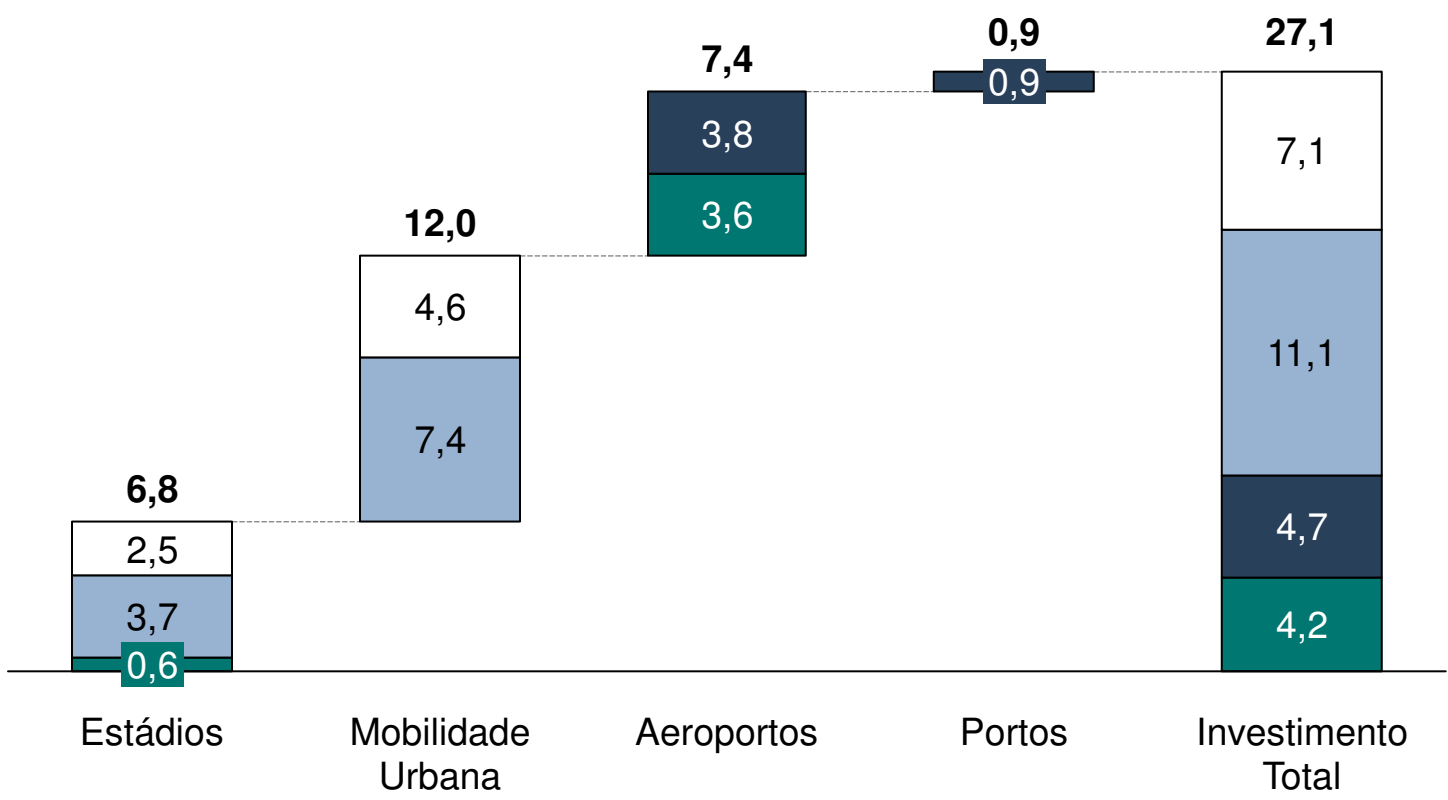

# Projetos


- 12
- 51
- 31
- 7
- 101



# Crescimento do número de obras em andamento associadas à Copa (60 vs. 34 no último balanço)

Número de empreendimentos em obras (ou concluídos) ao longo dos marcos temporais de publicação e balanços

*Além das 12 obras de estádios, mais 48 obras em andamento (5x mais obras)*

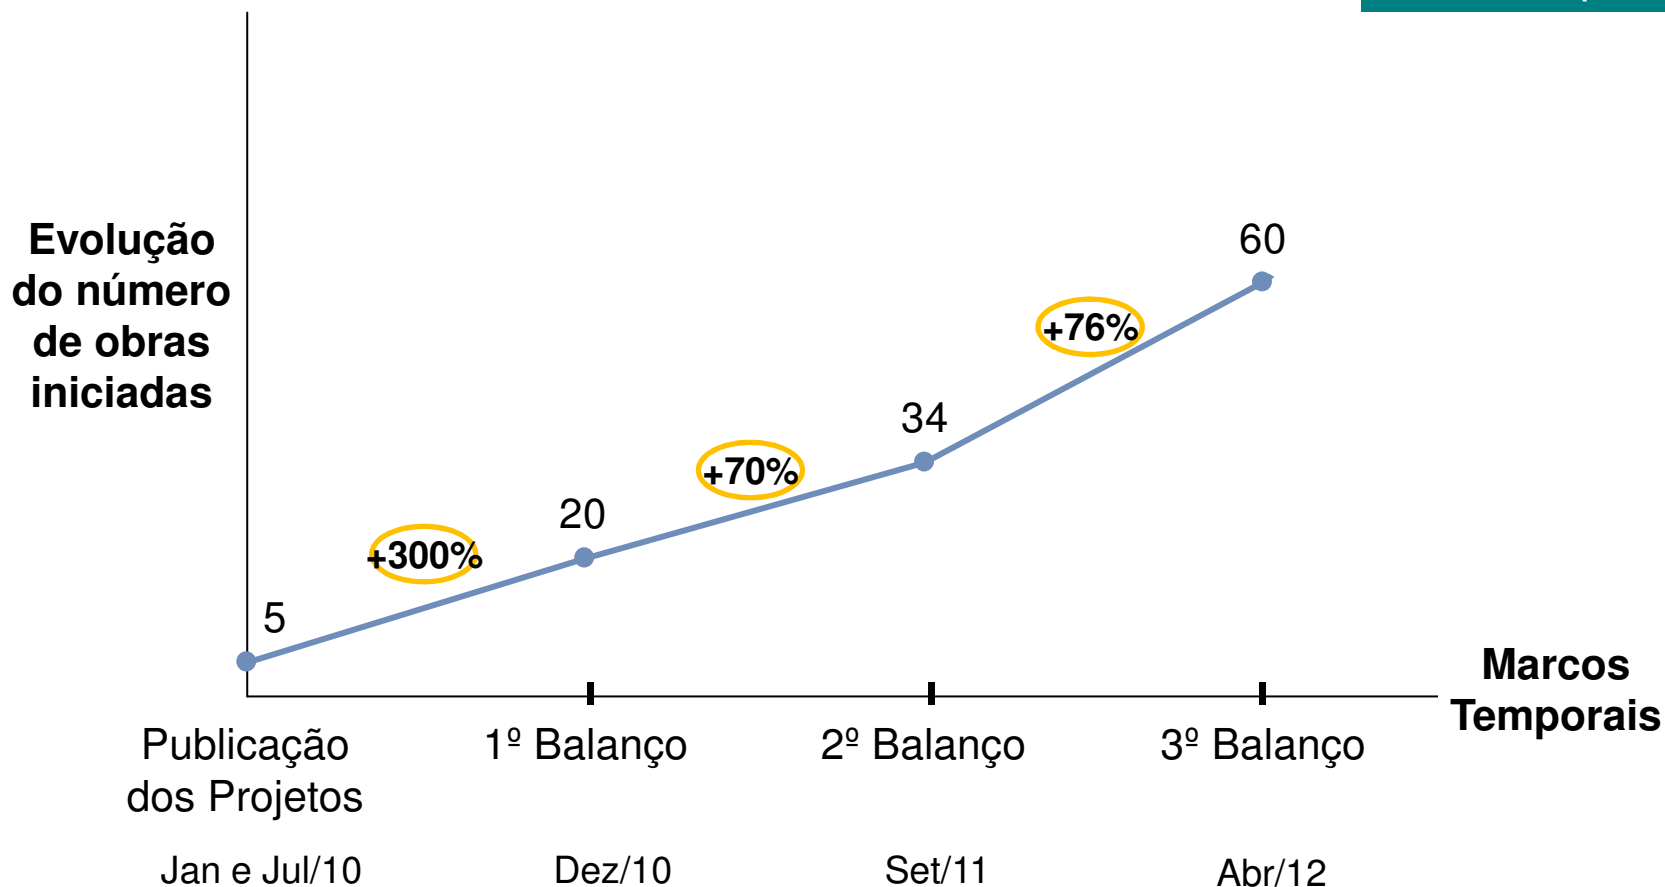


# Dos 101 empreendimentos, 55 estão em obras e 5 já foram entregues

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por estágio de execução

Cerca de 60% dos empreendimentos concluídos ou em obras

Número de empreendimentos

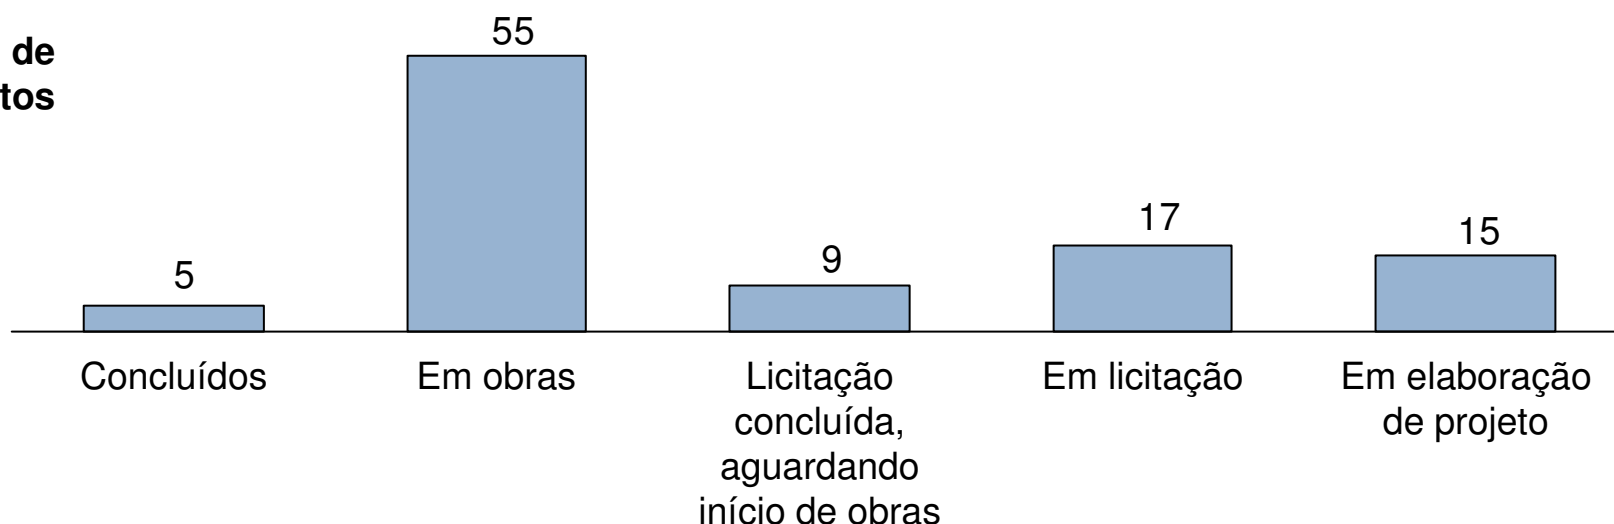

% dos empreendimentos

5% 54% 9% 17% 15%

Investimento (R\$, bi)

0,2 16,8 2,4 5,8 1,8

% em valor

1% 62% 9% 21% 7%




# A maioria dos empreendimentos será entregue em 2013, trazendo benefícios para as cidades antes mesmo do evento

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por data de conclusão

Cerca de 85% dos empreendimentos concluídos até 2013

Número de empreendimentos

% dos empreendimentos

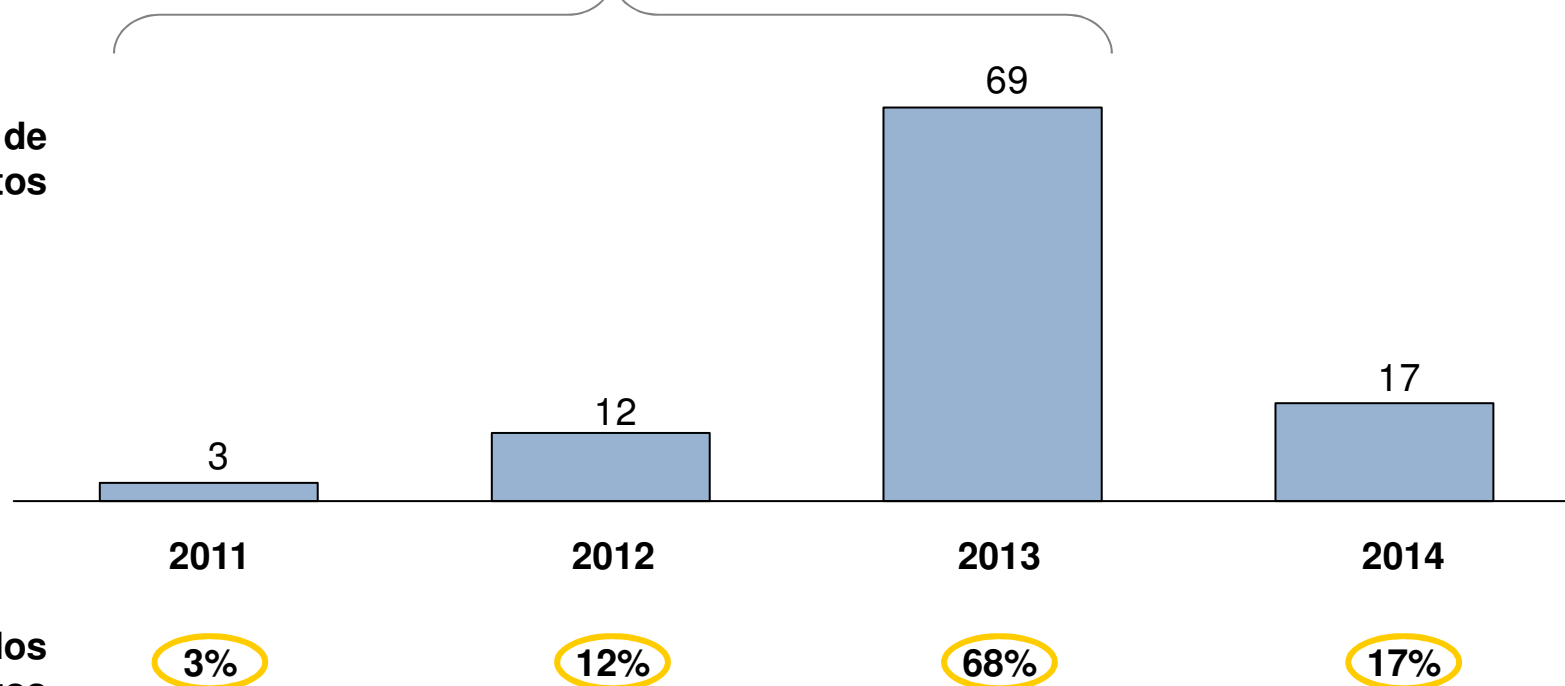

# Conteúdo do documento

- Visão Geral dos Preparativos

- Visão por Tema

- **Estádios**

- Mobilidade Urbana

- Aeroportos

- Portos






# Os estádios terão investimentos de R\$ 6,8 bilhões e geram quase 20 mil empregos diretos

R\$ Milhões, Abr/12		Investimento (R\$ milhões)	Financiamento (R\$ milhões)	Capacidade Bruta (mil)	# trabalhadores
<b>Privado</b> R\$ 1.384	São Paulo	820,0	400,0**	65	1.430
	Porto Alegre	330,0	235,0**	52	Não informado
	Curitiba	234,0	123,0**	41	93
<b>Público</b> R\$ 2.672	Brasília	812,2*	-	70	3.485
	R. Janeiro	808,4	400,0	79	4.800
	Manaus	532,2	400,0	44	1.096
	Cuiabá	518,9*	285,0	43	491
<b>PPP</b> R\$ 2.772	B. Horizonte	695,0	400,0	64	1.700
	Salvador	591,7	323,6	50	2.592
	Fortaleza	518,6	351,5	67	1.332
	Recife	500,2	400,0	46	1.881
	Natal	417,0	396,5	43	503
	<b>TOTAL</b>	<b>6.778,2</b>	<b>3.714,6</b>	<b>664</b>	<b>19.403</b>

Distribuição dos recursos por fonte

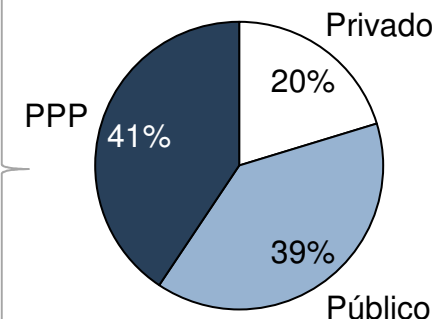

Nota: Foram considerados os assentos removíveis que serão montados para a Copa do Mundo (Natal: 10 mil, SP: 17 mil, Cuiabá: 18 mil)

\* Inclusão do valor estimado de itens ainda não contratados

\*\* Solicitação de financiamento em análise pelo BNDES

# 6 estádios têm previsão de entrega para a Copa das Confederações

Data base: Abril/12

 Percentual de execução previsto  Percentual de execução realizado

## Fortaleza



Conclusão: Dez/12

57%

62%

## Salvador




Conclusão: Dez/12

-

56%

## Belo Horizonte<sup>(1)</sup>

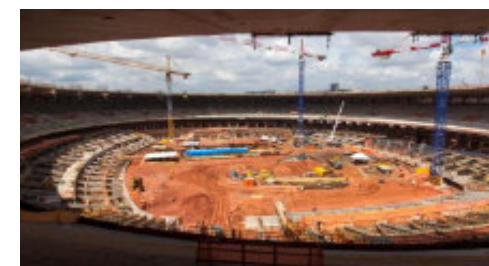

Conclusão: Dez/12

55%

55%

## Brasília<sup>(2)</sup>




Conclusão: Dez/12

52%

53%

## Rio de Janeiro

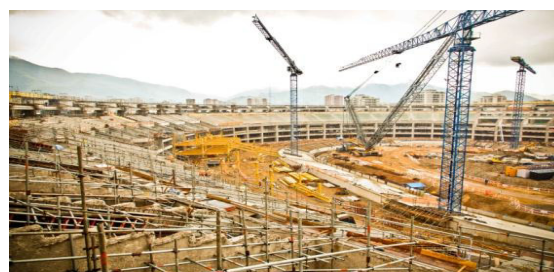

Conclusão: Fev/13

45%

45%

## Recife



Conclusão: Fev/13

36%

33%



(1) Considera fabricação de estrutura pré-moldada não instalada

(2) 53% corresponde ao andamento do contrato principal (não inclui cobertura)

# Os demais estádios para a Copa do Mundo têm entrega prevista até Dez/13

Data base: Abril/12



Percentual de execução previsto



Percentual de execução realizado

## Cuiabá



Conclusão: Dez/12

44%

40%

## Manaus



Conclusão: Jun/13

-

40%

## São Paulo



Conclusão: Dez/13

32%

32%

## Natal<sup>(1)</sup>



Conclusão: Dez/13

21%

22%

## Porto Alegre<sup>(2)</sup>



Conclusão: Dez/13

20%

20%

## Curitiba<sup>(3)</sup>



Conclusão: Jun/13

11%

11%



(1) Inclui demolições e retirada de infraestrutura de água, luz e esgoto dos antigos estádios e ginásio (Machadão e Machadinho)

(2) Valor referente ao contrato anterior. No aguardo da revisão do cronograma (o valor será de aproximadamente 8%)


(3) Percentual referente à obra da Matriz de Responsabilidades, que contempla reforma e ampliação de parte do estádio antigo e a nova obra



# Todos os estádios com financiamento contratado receberam recursos do BNDES; mais de R\$ 1 bilhão foi desembolsado

R\$ Milhões, Abr/12, Valor de financiamento contratado com o BNDES

Valor desembolsado

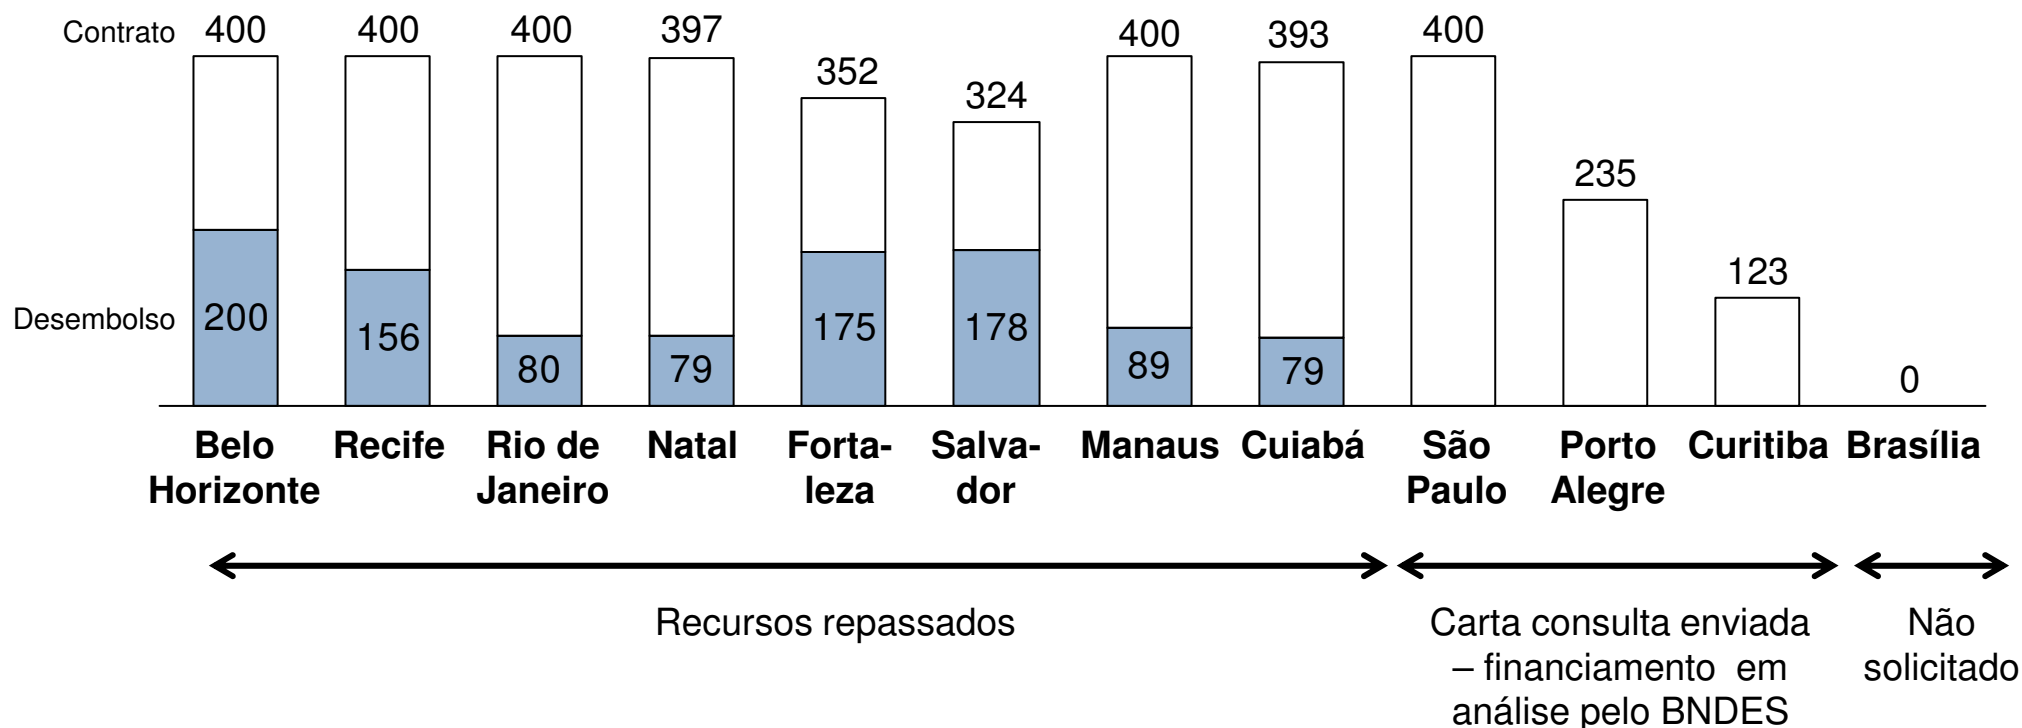

Nota: Para a cidade de Cuiabá, o contrato do BNDES é para a obra do estádio (R\$ 285,0 milhões) e para as obras de acesso à arena (R\$ 107,5 milhões)

# Conteúdo do documento

- Visão Geral dos Preparativos
- Visão por Tema
  - Estádios
  - **Mobilidade Urbana**
  - Aeroportos
  - Portos



# Os 51 empreendimentos de mobilidade urbana associados à Copa somam R\$ 12 bilhões; R\$ 7,4 de financiamento federal

R\$ Milhões, Referência Abr/12

	Projetos	Projetos	Valor total	Financ. Federal
<b>B. Horizonte</b>	8	BRT, via, controle de trânsito e corredor	1.389	1.023
<b>Brasília</b>	2	VLT e via	380	361
<b>Cuiabá</b>	3	VLT, via e corredor	1.440	562
<b>Curitiba</b>	9	BRT, via, controle de trânsito, corredor e estação	544	441
<b>Fortaleza</b>	6	VLT, estação e BRT	562	410
<b>Manaus</b>	2	Monotrilho e BRT	1.845	800
<b>Natal</b>	4	Via e corredor	662	361
<b>Porto Alegre</b>	10	BRT, via, controle de trânsito e corredor	560	484
<b>Recife</b>	5	BRT, via e estação	857	678
<b>R. Janeiro</b>	1	BRT	1.883	1.179
<b>São Paulo</b>	1	Monotrilho	1.882	1.082
<b>Total</b>	<b>51</b>		<b>12.004</b>	<b>7.381</b>




Ministério  
do Esporte

GOVERNO FEDERAL  
**BRASIL**  
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA


# Cerca de 30 empreendimentos de mobilidade urbana em obras nas cidades-sede da Copa

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por estágio de execução

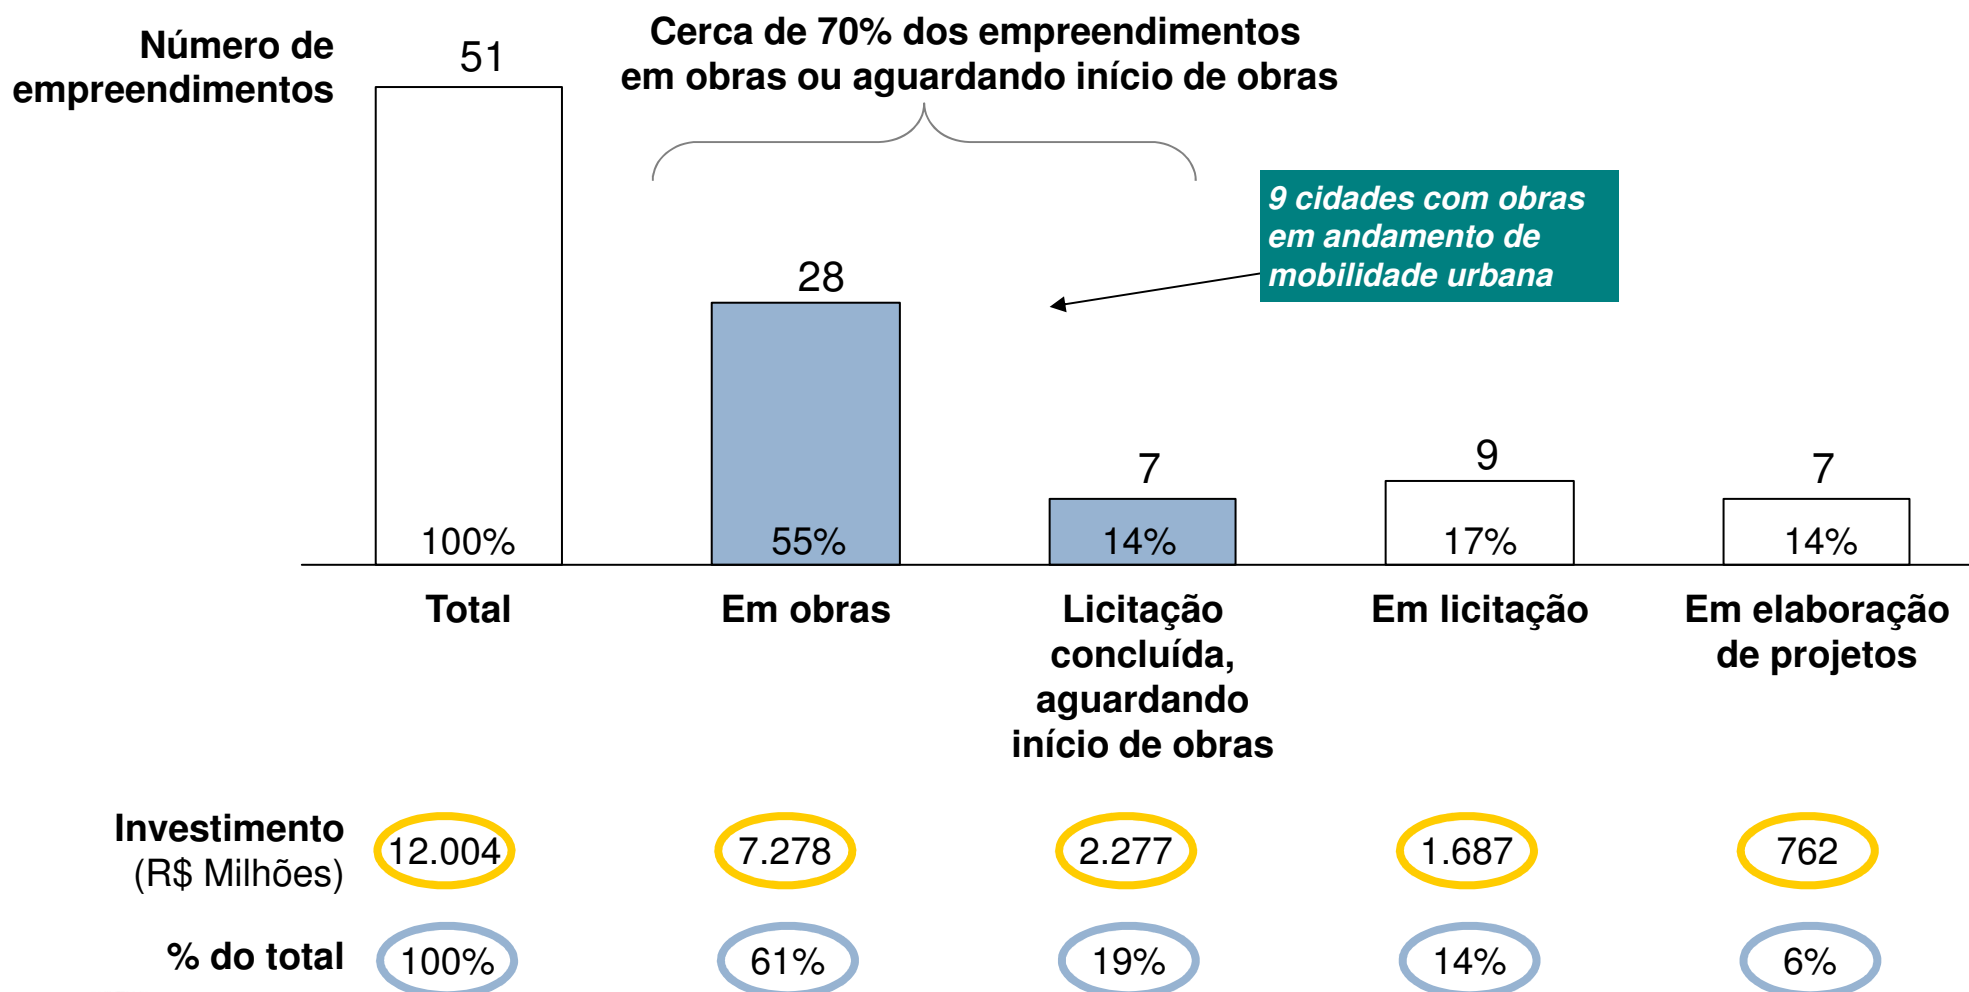

# 80% dos empreendimentos de mobilidade urbana serão entregues até Dez/13

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por data de conclusão

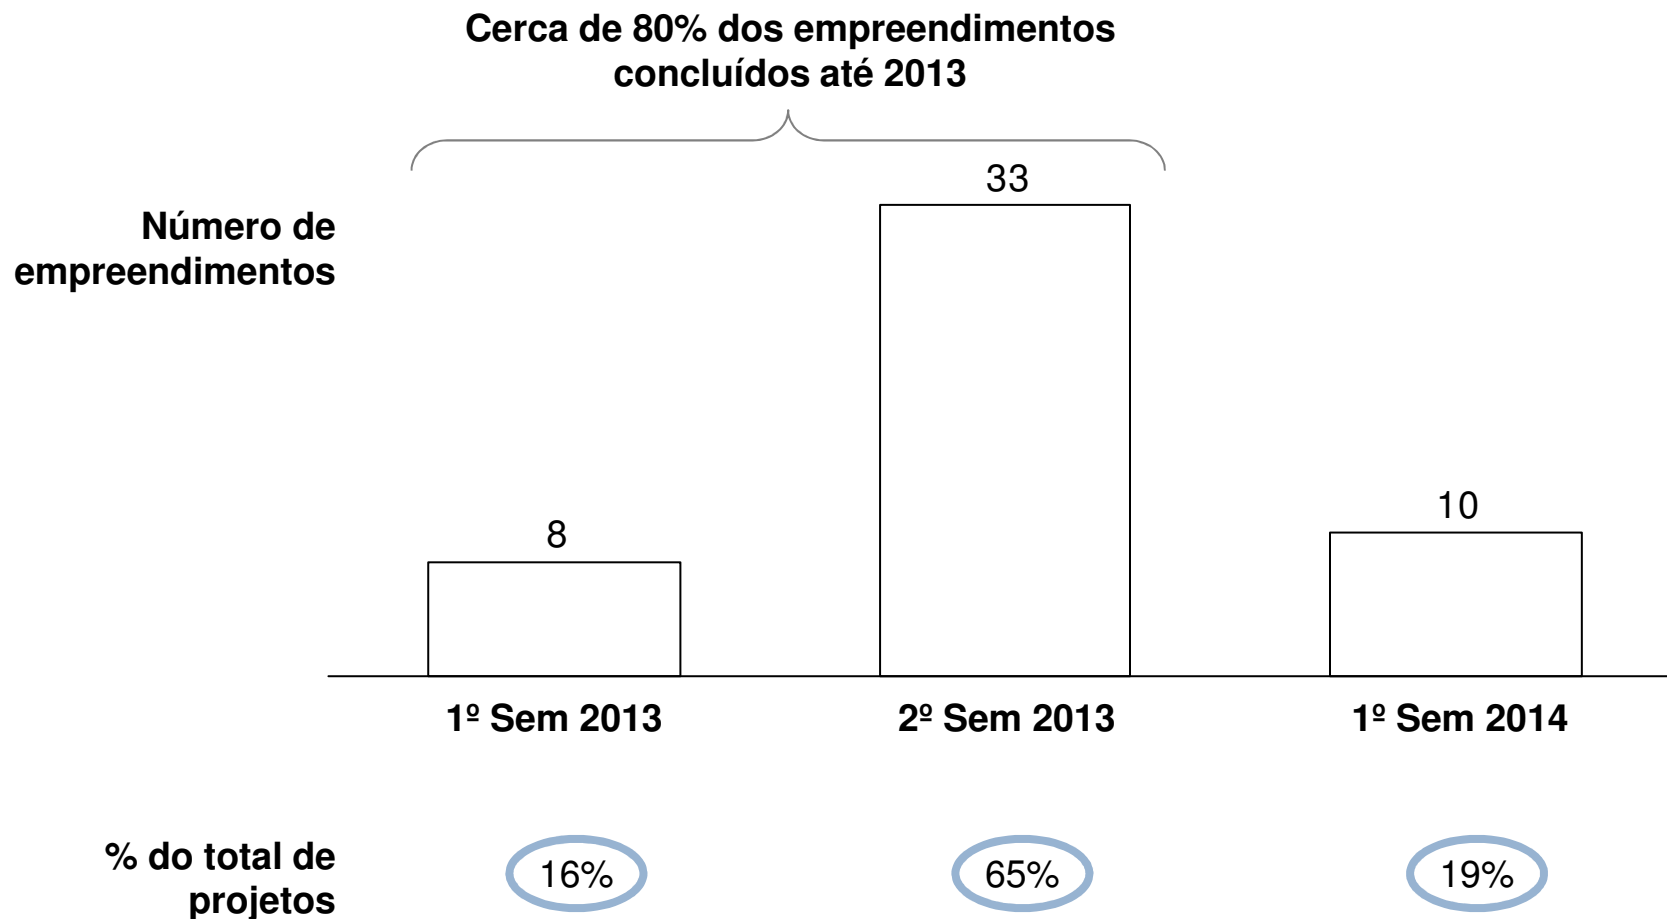



# Conteúdo do documento

- Visão Geral dos Preparativos
- Visão por Tema
  - Estádios
  - Mobilidade Urbana
  - **Aeroportos**
  - Portos



# Os investimentos em 13 aeroportos somam R\$ 7,4 bi; com R\$ 3,6 bi do setor privado

R\$ Milhões, Referência Abr/12


	Projetos	Projetos	Valor total	Infraero	Privado
<b>B. Horizonte</b>	3	TPS	509	509	-
<b>Brasília</b>	3	MOP, TPS	651	11	640
<b>Cuiabá</b>	2	MOP, TPS	91	91	-
<b>Curitiba</b>	3	TPS, pista/pátio	85	85	-
<b>Fortaleza</b>	1	TPS	350	350	-
<b>Manaus</b>	1	TPS	394	394	-
<b>Natal</b>	2	TPS, pista/pátio	558	183	375
<b>Porto Alegre</b>	3	MOP, TPS, pista/pátio	579	579	-
<b>Recife</b>	1	Torre de Controle	18	18	-
<b>R. Janeiro</b>	3	TPS, pista/pátio	813	813	-
<b>Salvador</b>	3	TPS, Torre, pista/pátio	48	48	-
<b>São Paulo</b>	4	TPS, pista/pátio	2.071	651	1.420
<b>Campinas</b>	2	MOP, TPS	1.187	7	1.180
<b>Total</b>	<b>31</b>		<b>7.354</b>	<b>3.739</b>	<b>3.615</b>



# Dos 31 empreendimentos de aeroportos, 13 estão em obras e 5 foram entregues

Abr/12, Número de empreendimentos


Cerca de 60% dos empreendimentos concluídos ou em obras

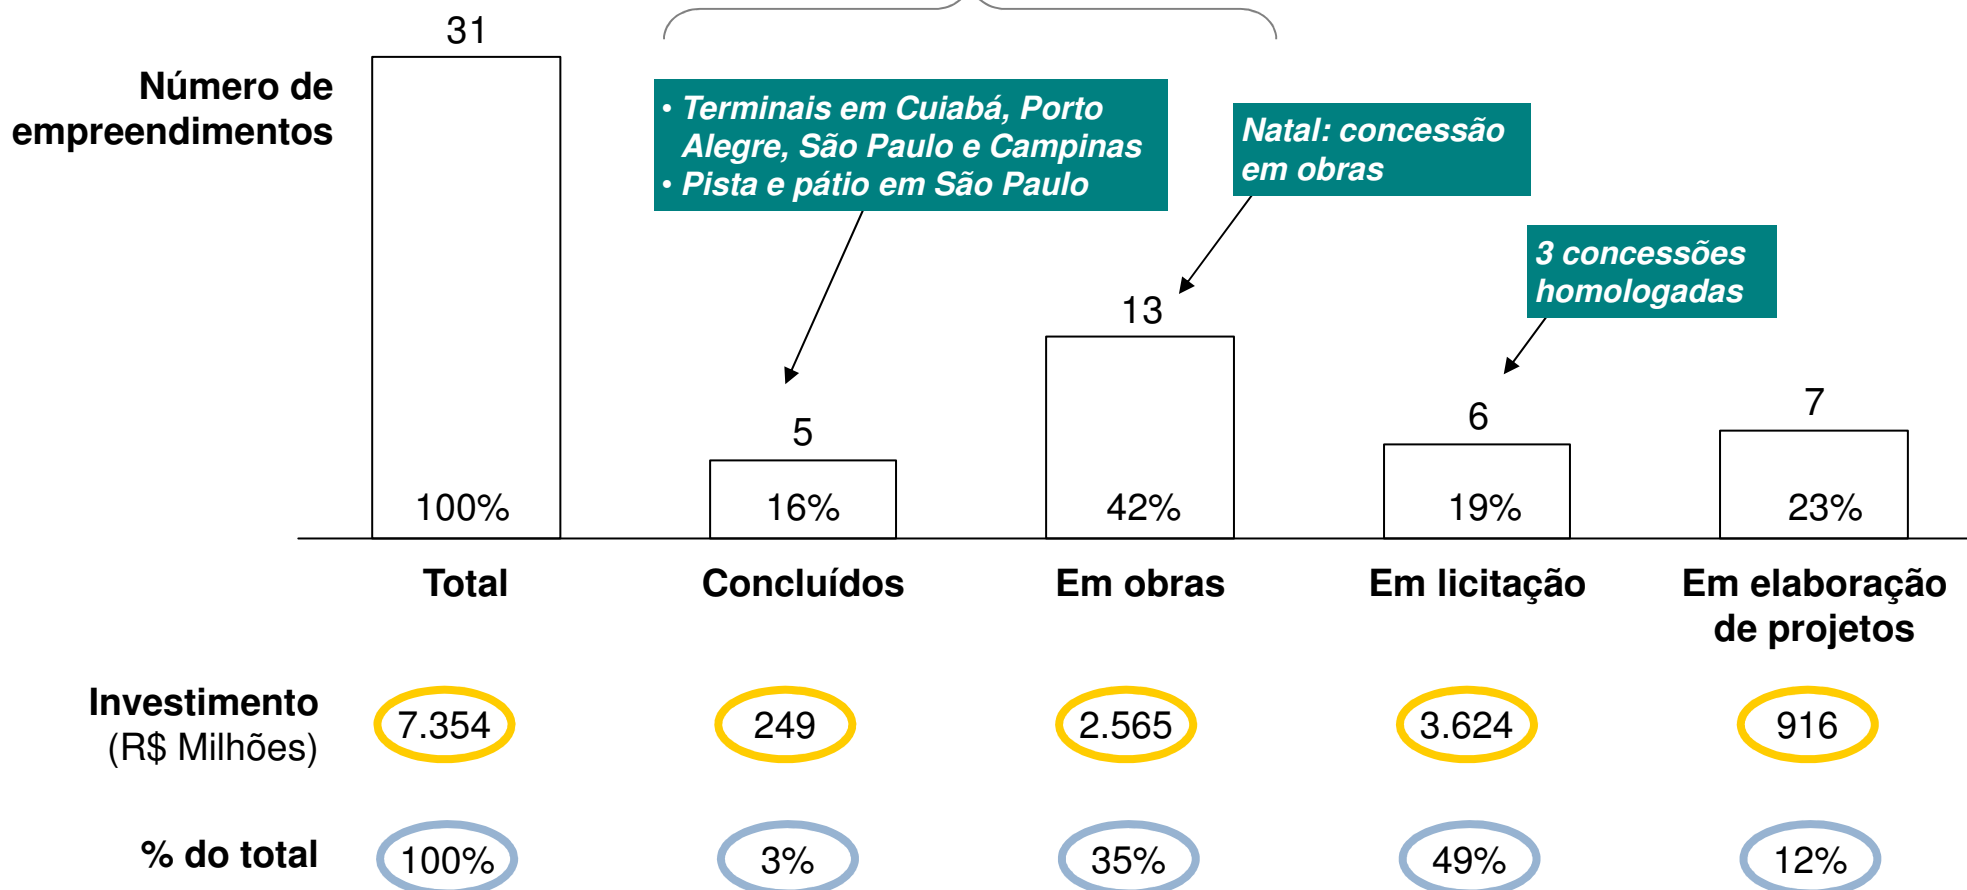

# Todos os empreendimentos previstos serão entregues para a Copa do Mundo

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por data de conclusão

Cerca de 85% dos empreendimentos concluídos até 2013

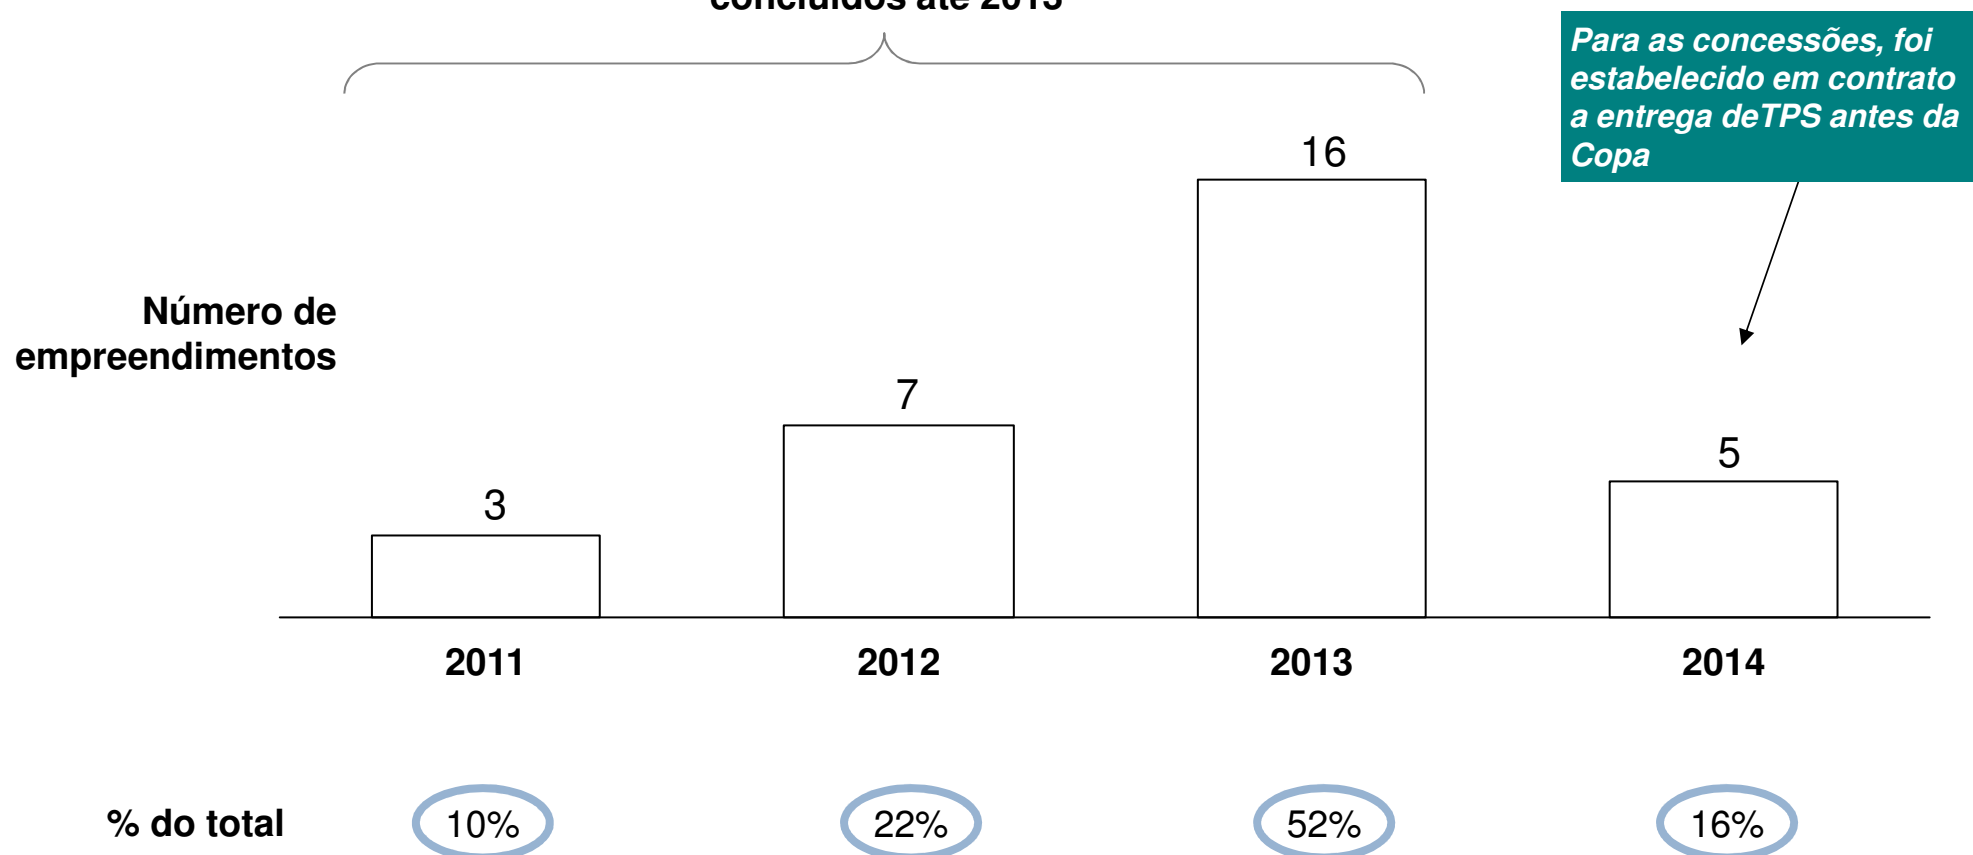





# Conteúdo do documento

- Visão Geral dos Preparativos
- Visão por Tema
  - Estádios
  - Mobilidade Urbana
  - Aeroportos
  - **Portos**



# R\$ 900 mi de investimentos para readequação e revitalização de 7 portos

Data Base: Abr/12

Cidade-Sede		Tipo de intervenção	Investimento (R\$ Mi)	Estágio Atual	Data de Entrega
<b>Fortaleza</b>		Terminal marítimo	149,0	Em obras	Nov/2013
<b>Recife</b>		Terminal marítimo	25,7	Em obras	Jun/2013
<b>Natal*</b>		Terminal marítimo	53,7	Em obras	Ago/2013
<b>Salvador*</b>		Terminal marítimo	36,0	Em obras	Abr/2013
<b>Santos</b>		Alinhamento de cais	235,0	Em licitação	Nov/2013
<b>Rio de Janeiro</b>		Implantação de píer em Y	314,0**	Em licitação	Mai/2014
<b>Manaus</b>		Terminal hidroviário	89,4	Em elaboração de projeto	Mar/2014
			<b>902,8</b>		



\* Obras iniciadas em Maio/12, após a data base de fechamento do balanço (Abril/12)

\*\* O valor de R\$ 314 milhões refere-se às etapas 1 e 2. O cronograma refere-se apenas à etapa 1
