



Ministério
do Esporte



4º Balanço de Ações para a Copa (1º Ciclo)


Cidade-sede de Fortaleza

Dezembro de 2012

Fortaleza: Distribuição dos Investimentos por Tema e Fonte de Recursos

Referência Nov/12, Distribuição dos investimentos por tema. R\$ Milhões

■ Financiamento Federal
■ Orçamento Federal
■ Recursos Locais

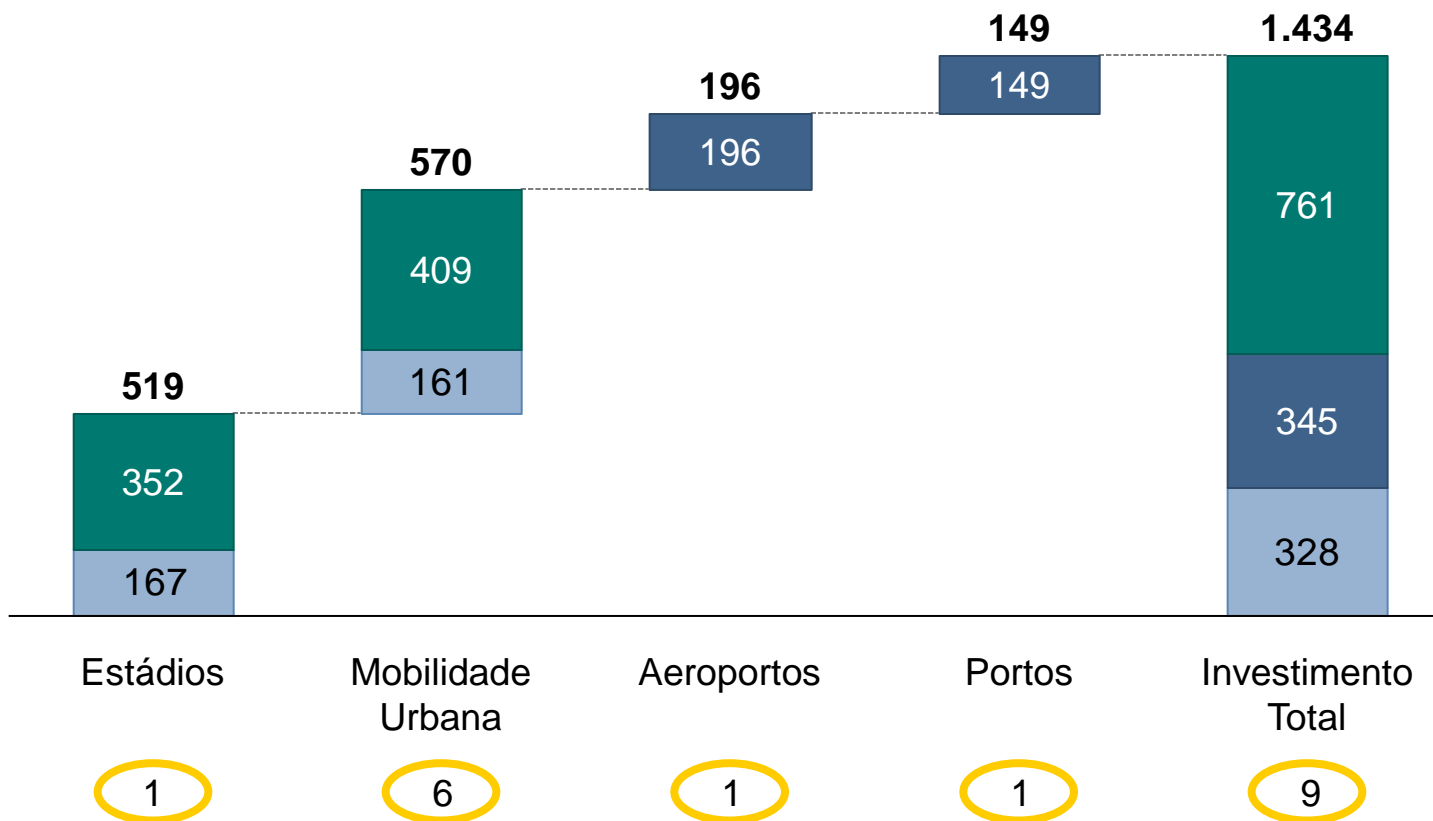

Projetos



Conteúdo do documento

- **Estádio**

- Mobilidade Urbana

- Aeroporto

- Porto



Fortaleza: Estádio Governador Plácido Castelo (Castelão)



Tipo de Intervenção: Reforma

Capacidade: 63.763 lugares

Responsável Obra: Governo Estadual

Modelo de Investimento : PPP

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: 99,5%

Realizado: 96,5%

Investimento: R\$ 518,6 milhões ¹

• Gov. Estadual: R\$ 167,1 mi (32,2%)

• Gov. Federal (financ. BNDES): R\$ 351,5 mi (67,8%)

Situação Financiamento: Contratado, com desembolso de R\$ 248,6 mi

Monitoramento

	Projeto Básico	Processo Licitatório (Obras)	Gerenciamento Obras	Obras (Estádio e Entorno)
Início	Jan/09	Dez/09	Mar/11	Dez/10
Fim	Dez/09	Dez/10	Dez/12	Dez/12
Recurso Estadual (R\$ mi)	5,8	-	-	161,3
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	351,5
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	-	Gov. Estadual (Concessionário)
Situação	Concluído	Concluído	Em Andamento	Em Andamento

Em Andamento: terraplenagem, estrutura e instalações (4ª etapa)

Resultados	Restrições	Providências
<ul style="list-style-type: none"> Gerenciamento contratado em Mar/11 RECOPA aprovado no Ministério do Esporte; em análise na STN 		<ul style="list-style-type: none"> Concluir comissionamento - Fev/13

¹ Os valores referentes a projeto executivo, certificação ambiental e operação do estádio estão incluídos no valor das obras. Não inclui valores de gerenciamento.

O valor também inclui operação do estádio por 8 anos.

Nota: O entorno do estádio é composto por estacionamentos, prédio da Secretaria de Esportes e praças

Legenda: RECOPA – Regime Especial de Tributação para Construção, Ampliação, Reforma ou Modernização de Estádios de Futebol



Conteúdo do documento

- Estádio


- **Mobilidade Urbana**

- Aeroporto

- Porto



Fortaleza: Intervenções em Mobilidade Urbana

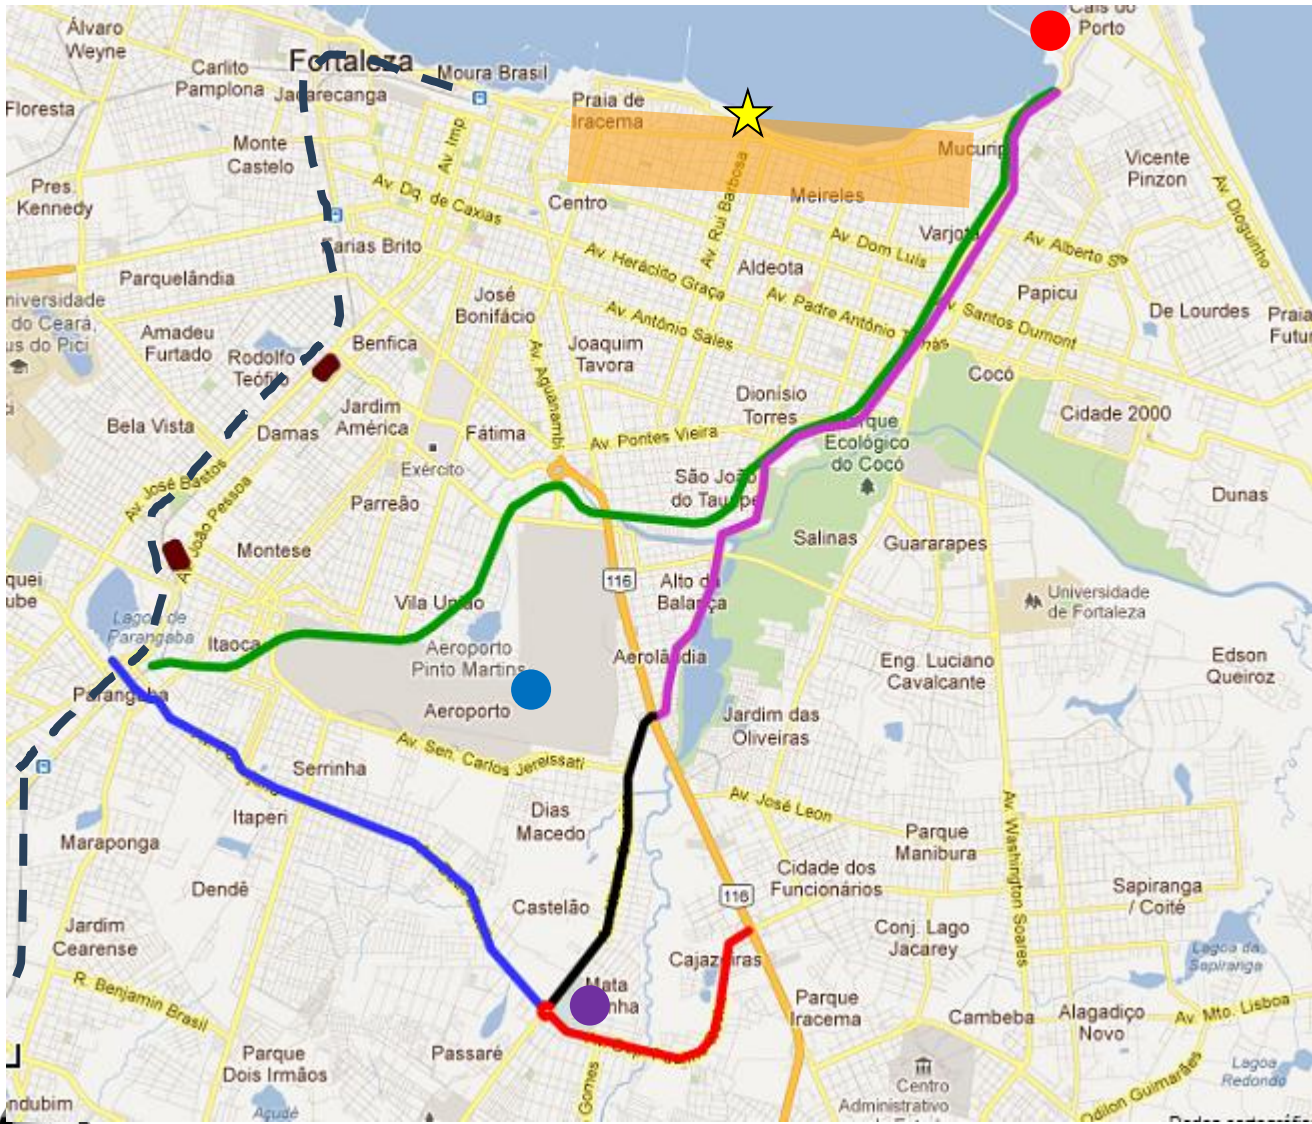

Projetos:

- VLT Parangaba/Mucuripe
- Estações Padre Cícero e JK
- Eixo Via Expressa/Raul Barbosa
- BRT Av. Dedé Brasil
- BRT Av. Alberto Craveiro
- BRT Av. Paulino Rocha

Referências:

- Estádio Castelão
- Aeroporto Pinto Martins
- Porto Mucuripe
- Setor Hoteleiro

Modais:

- - - Metrô

Eventos:

- ★ Fan Fest



Fortaleza: VLT Parangaba/Mucuripe



Descrição: Liga Parangaba (terminal intermodal) ao Mucuripe (Porto e região hoteleira), passando pela Rodoviária e Aeroporto

Escopo: 13 km e 10 estações

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: 15,3%

Realizado: 19,5%

Investimento: R\$ 273,8 milhões

•Gov. Estadual: R\$ 103,8 mi (38,0%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 170,0 mi (62,0%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Mai/10	Mai/10	Out/11	Mar/12
Fim	Jul/11	Set/13	Fev/12	Mar/14
Recurso Estadual (R\$ mi)	3,3	100,5	-	-
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	170,0
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados	Restrições	Providências
<ul style="list-style-type: none"> Licença de Instalação emitida em Fev/12 – validade: Fev/13 Desapropriados 19 imóveis de 2.185 Cadastramento Social Realizado de 1.970 famílias Laudos de Avaliação Realizados de 1.403 imóveis 		<ul style="list-style-type: none"> Obter primeiro desembolso CAIXA - Dez/12 Testes e operação assistida do VLT - Jan/14 a Mar/14

Fortaleza: Eixo Via Expressa / Raul Barbosa



Descrição: Via de ligação entre Zona Hoteleira e aeroporto

Escopo: 7 km e 5 obras de arte especiais

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: não informado*

Realizado: 5,0%

Investimento: R\$ 151,6 milhões

•Gov. Municipal: R\$ 9,9 mi (6,5%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$141,7 mi (93,5%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Jul/10	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Out/13	Ago/12	Dez/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	3,8	-	5,8
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	141,7
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Novo contrato de obras assinado em Ago/12
- Obras das vias e túneis reiniciadas em Out/12
- Desapropriadas 19 áreas de 363, sendo que a desapropriação da Via Expressa é de responsabilidade Estadual
- Licença de Instalação para vias e túneis emitida em Fev/12

Restrições

Providências

- Obter Licença de Instalação para viaduto - Dez/12
- Obter primeiro desembolso CAIXA – Jan/13
- Iniciar obras do viaduto - Jan/13



* O cronograma fornecido não possibilita a leitura do % previsto

Fortaleza: BRT Avenida Dedé Brasil



Descrição: Liga o Terminal Intermodal da Parangaba (estação final do VLT Parangaba/Mucuripe) ao estádio

Escopo: Requalificação de via com implantação de estações do sistema BRT, 6 km e 2 obras de arte especiais (viadutos)

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras
% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: não informado*

Realizado: 7,0%

Investimento: R\$ 41,6 milhões

•Gov. Municipal: R\$ 20,0 mi (48,1%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 21,6 mi (51,9%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Set/10	Out/11	Fev/12
Fim	Jul/11	Out/13	Ago/12	Dez/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	10,0	-	9,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	21,6
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Novo contrato de obras assinado em Ago/12
- Obras reiniciadas em Set/12
- Emitidas Licenças de Instalação para as obras da via em Jan/12 e para os 2 viadutos em Nov/12
- Desapropriações em fase de levantamento e cadastramento de imóveis

Restrições

Providências

- Obter primeiro desembolso CAIXA – Jan/13
- Iniciar obras dos 2 viadutos – Jan/13

* O cronograma fornecido não possibilita a leitura do % previsto

Fortaleza: BRT Avenida Alberto Craveiro



Descrição: Liga o BRT Raul Barbosa ao estádio. Parte do eixo que liga a região hoteleira ao estádio

Escopo: 3 km e 1 obra de arte especial

Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: não informado*

Realizado: 21,0%

Investimento: R\$ 33,7 milhões

•Gov. Municipal: R\$ 10,0 mi (29,7%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 23,7 mi (70,3%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Out/10	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Abr/13	Ago/12	Ago/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	9,7	-	-
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	23,7
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Novo contrato de obras assinado em Ago/12
- Obras reiniciadas em Ago/12
- Desapropriadas 58 áreas do total de 117

Restrições

Providências

- Obter primeiro desembolso CAIXA – Jan/13

* O cronograma fornecido não possibilita a leitura do % previsto



Fortaleza: BRT Avenida Paulino Rocha



Descrição: Continuação do BRT Dedé Brasil para ligação do Terminal Intermodal da Parangaba e da BR-116 ao estádio
Escopo: Requalificação de via com implantação de estações do sistema BRT, 2 km e 1 obra de arte especial (túnel na rotatória)
Responsável: Governo Municipal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: não informado*

Realizado: 6,0%

Investimento: R\$ 34,6 milhões

•Gov. Municipal: R\$ 15,0 mi (43,4%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 19,6 mi (56,6%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/09	Jan/11	Out/11	Jan/12
Fim	Jul/11	Abr/13	Ago/12	Ago/13
Recurso Municipal (R\$ mi)	0,3	3,0	-	11,7
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	19,6
Execução	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal	Gov. Municipal
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados	Restrições	Providências
<ul style="list-style-type: none"> • Novo contrato de obras assinado em Ago/12 • Obras reiniciadas em Set/12 • Desapropriações em fase de avaliação dos valores dos imóveis – estimativa de 67 imóveis 		<ul style="list-style-type: none"> • Obter primeiro desembolso CAIXA - Dez/12



* O cronograma fornecido não possibilita a leitura do % previsto

Fortaleza: Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek



Descrição: Implantação de duas estações na Linha Sul do Metrô de Fortaleza

Escopo: 2 estações de metrô

Responsável: Governo Estadual

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12

Previsto: 22,7%

Realizado: 17,9%

Investimento: R\$ 35,0 milhões

•Gov. Estadual: R\$ 1,8 mi (5,1%)

•Gov. Federal (financ. CAIXA): R\$ 33,2 mi (94,9%)

Situação Financiamento: Contratado, sem desembolso

Monitoramento

	Projetos Básico e Executivo	Desapropriação	Processo Licitatório (Obras)	Obras
Início	Set/10	Fev/12	Dez/11	Jun/12
Fim	Abr/11	Jun/13	Jun/12	Dez/13
Recurso Estadual (R\$ mi)	0,8	1,0	-	-
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	33,2
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual
Situação	Concluídos	Em Andamento	Concluído	Em Andamento

Resultados	Restrições	Providências
<ul style="list-style-type: none"> • Ordem de serviços emitida em Jun/12 • Desapropriações em fase de negociações. Estimado:155 imóveis 		<ul style="list-style-type: none"> • Obter primeiro desembolso CAIXA – Fev/13



Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- **Aeroporto**
- Porto



Fortaleza: Aeroporto Internacional Pinto Martins



Projeto: TPS e Sistema Viário

Descrição: Projeto executivo, reforma e ampliação do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário (1ª Fase)

Modelo de Investimento: Público (Infraero)

Responsável: Governo Federal (Infraero)

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Nov/12:

Previsto: --

Realizado: 8,7 %

Investimento: R\$ 195,8 milhões

Monitoramento

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental ¹	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Set/09	Jun/12	Set/10	Dez/11	Jun/12
Fim	Out/11	Dez/13	Jul/11	Mai/12	Dez/13
Recurso Federal (R\$ mi)	4,6	- ²	-	-	191,2
Execução	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Estadual (SEMACE)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
Situação	Concluído	Em Andamento	Concluído	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Projeto Executivo e Obras executados 8,69 % até 30/Nov/12

Restrições

Providências

¹ Licenciamento Ambiental com valor quitado e não contabilizado no valor total deste projeto. Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras

² O valor do Projeto Executivo encontra-se dentro do valor da obra

Legenda: SEMACE - Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará



Conteúdo do documento

- Estádio
- Mobilidade
- Aeroporto

• **Porto**



Fortaleza: Terminal Marítimo de Fortaleza (Mucuripe)



Projeto: Porto de Fortaleza - Terminal Marítimo de Passageiros

Descrição:

Implantação de Terminal Marítimo de Passageiros, Construção de Cais para 1 Berço para Múltiplo Uso, Pavimentação e Urbanização de Via Interna de Acesso, Estacionamento e Pátio

Modelo de Investimento: Público (SEP)

Responsável: Governo Federal

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra – Out/12:

Previsto: 46,0 %

Realizado: 36,0 %

Investimento: R\$ 149,0 milhões

Monitoramento

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Mai/11	Mar/12	Jun/10	Out/11	Mar/12
Fim	Ago/11	Jun/12	Jan/12	Fev/12	Nov/13
Recurso Federal (R\$ mi)	-	-	-	-	149,0
Execução	Gov. Federal (CDC)	Gov. Federal (CDC)	Gov. Estadual (SEMACE)	Gov. Federal (CDC)	Gov. Federal (CDC)
Situação	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento

Resultados

- Auxílio à Fiscalização - Propostas de Preços abertas em Ago/12
- Elevadores e Escadas - Publicados vencedores do pregão eletrônico em Set/12

Restrições

Providências



Legenda: SEMACE - Superintendência Estadual de Meio Ambiente do Ceará
CDC - Companhia Docas do Ceará
